

65.30
У 685

НА ПРАВАХ РУКОПИСИ.

УРАЛМАШИНОСТРОЙ.





Электродпечь им. Косарева.

ЦИФРОВЫЕ ИТОГИ

3 квартала 1932 года.

Б 1435760 - ко

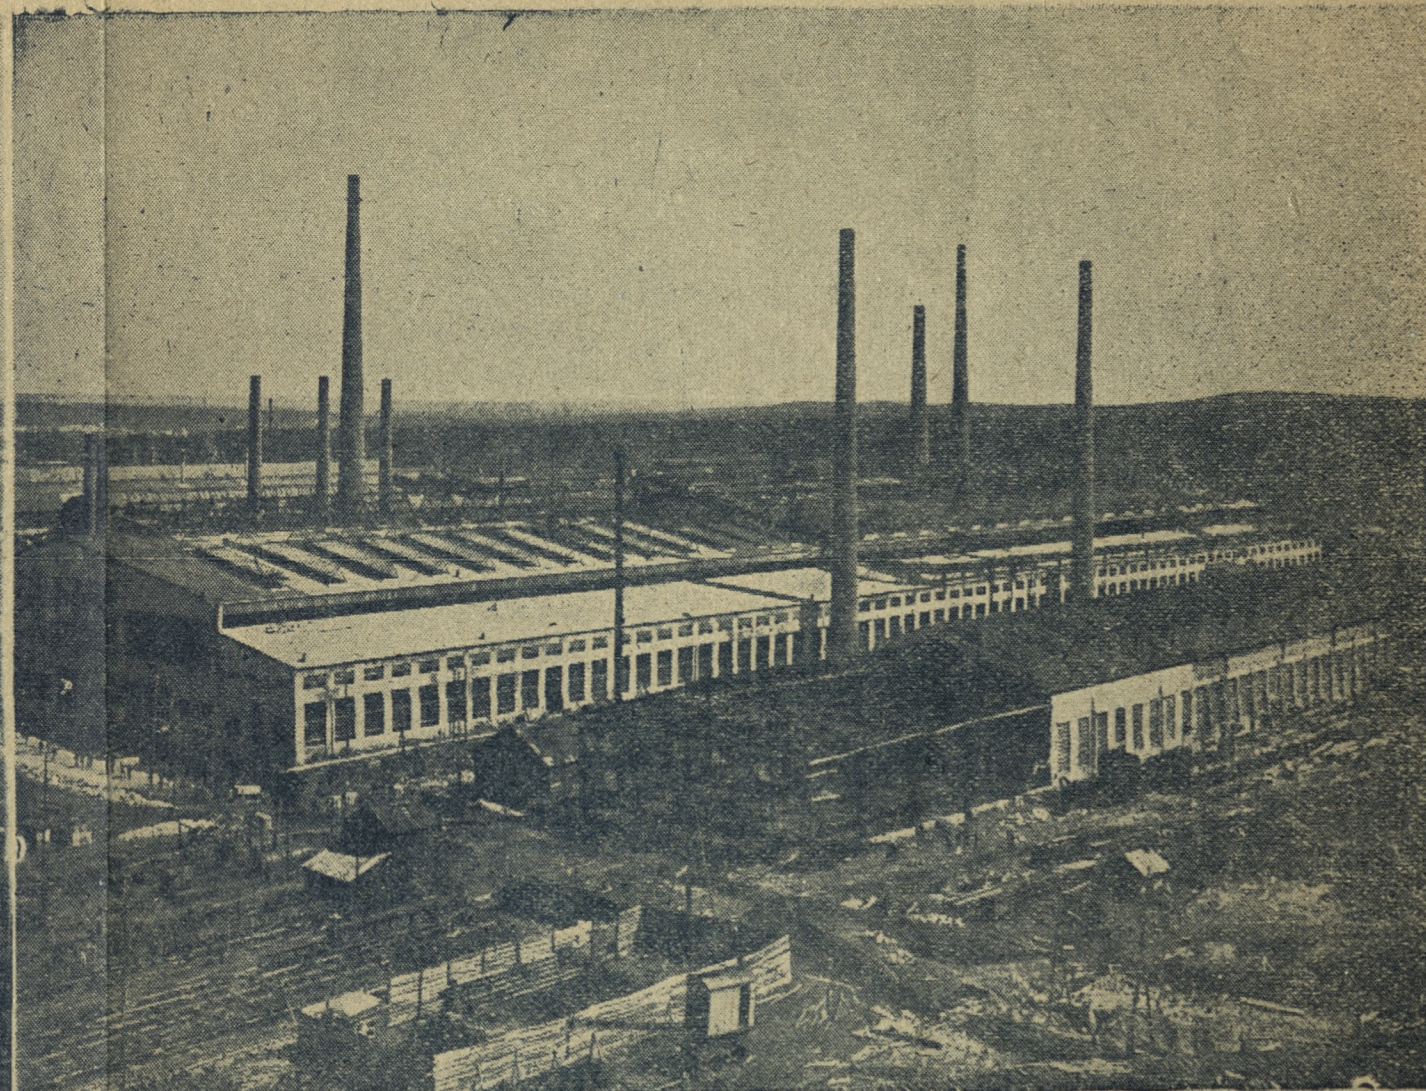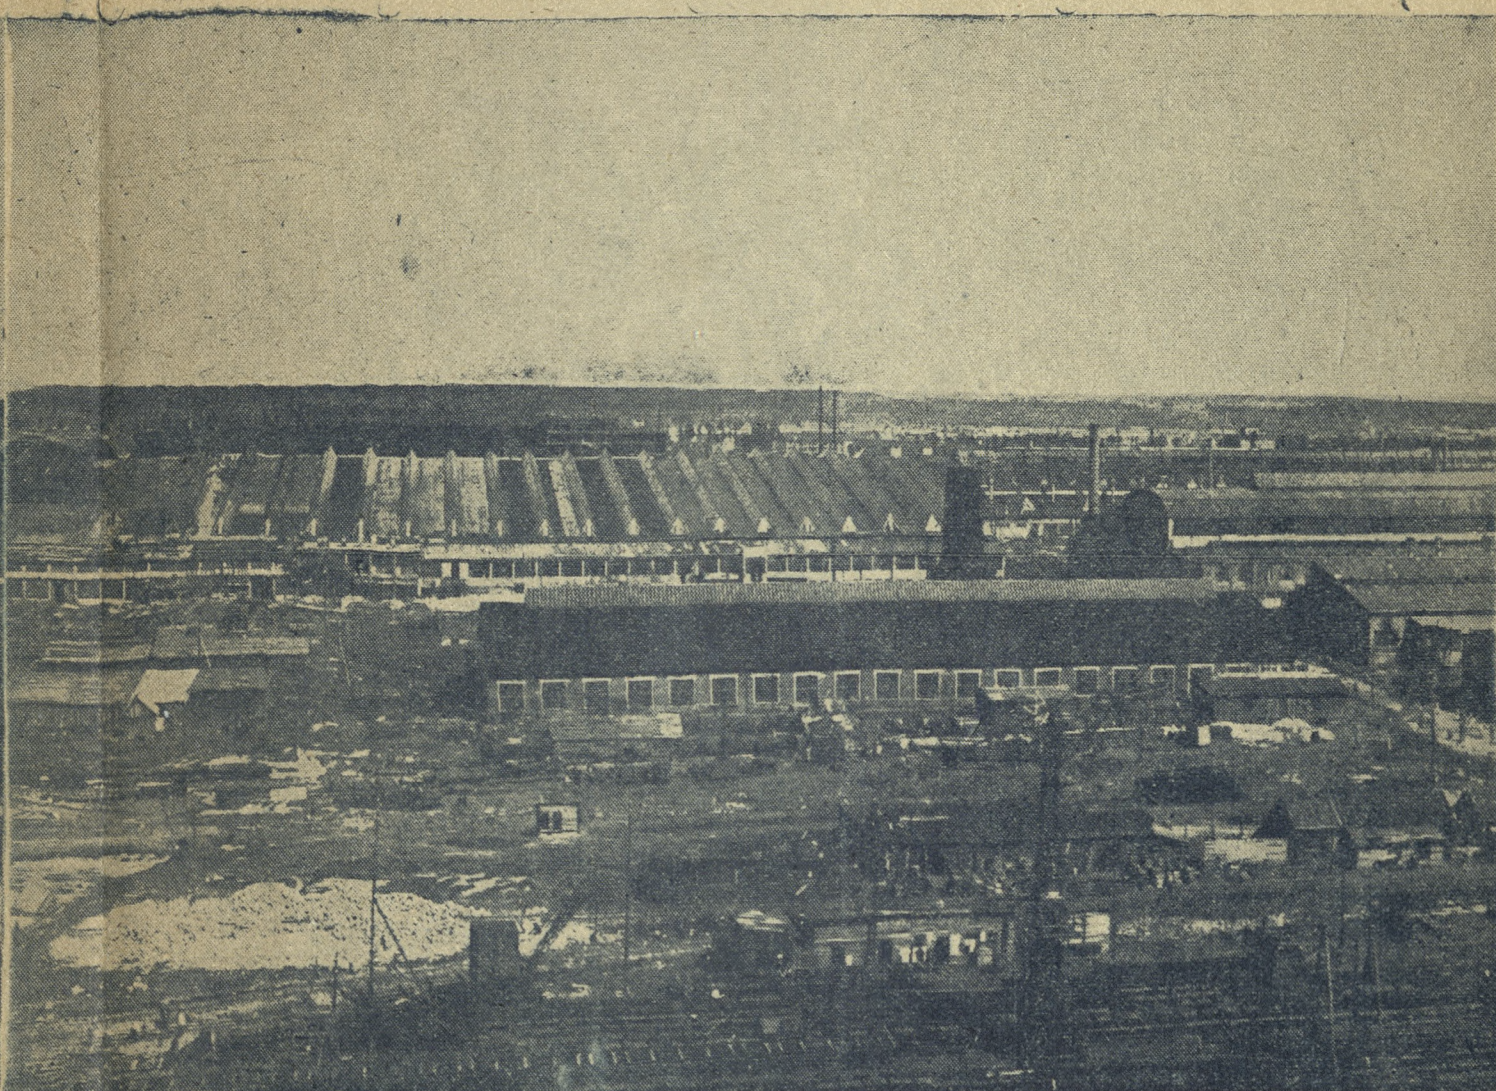

Вид на завод с южной стороны.

Цифровые итоги работы Уралмашиностроя

за третий квартал
1932 года.

Выполнение плана капитальных работ

в сметно-плановых

Наименование объектов	ПЛАН И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗА 3 КВАРТАЛ 1932 Г. (числитель — план, знаменатель — выполнение)									
	Строит. работы		Оборудов. СССР		Оборудование импорти.		Монтаж оборудов.		В с е г о	
	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Предварит. работы										
Планировка заводск. площадки	91	—	—	—	—	—	—	—	91	—
II. Произв. и вспомог. здания и сооружения										
Механический цех	1400 1146 200	81,9	550 412	74,9	2291 588	25,7	259 559	207,8	4500 2705 200	60,1
Чугунолитейный цех	122 25	61,0	— 165	—	— 94	—	51 16	—	174 300	87,0
Сталелитейный цех	153 120	—	— —	—	109 —	116,0	51 —	—	313 120	104,3
Склад опок для лит. цехов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кузнечно-Прессовый цех	2400 1144 10	47,7	1100 55	5,0	1280 1101	86,0	220 206	93,6	5000 2506 100	50,1
Термический цех № 1	125	—	6	10,5	24	88,9	34	—	189	189,0
„ „ № 2	129	—	—	—	—	—	—	—	129	—
Цех металлич. конструкций	700 141	20,1	1045 89	8,5	—	—	55 1	1,8	18000 231	12,8
Модельный цех и склад	— 20	—	— 38	—	—	—	2 19	—	40 39	97,5
Сушилка и склад дерева	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Инструментальный цех	—	—	19	—	162	—	19	10,5	200	1,0
Ремонтно-механическ. цех	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
Ремонтно-строительн. цех	4	—	2	—	—	—	—	—	6	—
ИТОГО по ст. II	4855 2984	61,5	2974 570	19,2	3854 1822	47,3	577 923	160,0	12260 6299	51,4
III. Подсобн. и хоз. заводск. здания и сооружения										
A. Энергетическое хоз-во										
Электроотопит. и компрес. станция	400 265	66,2	— 114	—	— 53	—	— 206	—	400 638	159,5
Линия электропередачи на завод от район. подстанц. до водопод. сооружений	—	—	40	—	—	—	4	—	50	—
Промышл. водопр. от В. Исетского пруда до завода	220 122	55,5	—	—	—	—	—	—	220 122	55,5

за 3-ий квартал и с начала 1932 г.

ценах (в тыс. руб.).

ПЛАН НА 1932 Г. И ВЫПОЛНЕНИЕ НА 1-ое ОКТЯБРЯ 1932 Г.														
Строит. работы			Оборудов. СССР			Оборудов. импорти.			Монтаж оборудов.			В с е г о		
План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.	План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.	План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.	План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.	План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
200	342	171,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	342	171,0
5000	4322	86,4	1785	994	55,7	5467	2970	54,3	855	918	107,4	13107	9204	70,2
400	637	159,2	358	166	46,4	405	117	28,9	100	210	210,0	1263	1130	89,5
300	609	203,0	570	251	44,0	605	322	53,2	150	189	126,0	1625	1371	84,4
350	—	—	58	81	139,7	13	—	—	2	—	—	423	81	19,2
3907	3917	100,3	2430	116	4,8	4700	2528	53,8	1500	383	25,5	12537	6944	55,4
20	272	—	230	17	7,4	202	129	63,9	57	65	114,0	509	483	94,9
—	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129	—
2800	584	20,9	1106	174	15,7	540	155	28,7	225	21	9,3	4671	934	20,0
15	38	253,3	96	6	6,2	85	6	7,1	14	25	178,6	210	75	35,7
13	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—	61	—	—
38	8	21,1	32	1	3,1	296	66	22,3	37	26	70,3	403	101	25,1
—	21	—	—	5	—	7	5	71,4	1	—	—	8	31	—
5	1	20,0	—	11	—	—	—	—	—	—	—	5	12	240,0
12848	10538	82,0	6713	1822	27,1	12320	6298	51,1	2941	1837	62,5	34822	20495	58,9
400	1369	342,2	1800	815	45,3	617	192	31,1	340	693	204,4	3157	3071	97,3
—	—	—	212	14	6,6	—	—	—	20	7	35,0	232	21	9,1
1114	649	58,3	154	54	35,1	42	62	147,6	24	27	112,5	1334	792	59,4

Наименование объектов	ПЛАН И ВЫПОЛНЕНИЕ ЗА 3 КВАРТАЛ 1932 Г. (числитель—план, знаменатель—выполнение)									
	Строит. работы		Оборудов. СССР		Оборудов. импорт.		Монтаж оборудов.		В с е г о	
	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канализ. энергии по заводу	60	211,7	220	89,1	54	—	16	225,0	350	102,6
Обор. гл. прохода кранами	127	—	196	—	—	—	36	—	359	—
Газогенераторная станция	60	—	39	—	—	—	1	—	100	—
Канализ. газа (газопров. до зданий)	50	—	66	—	—	—	4	—	120	—
	329	—	265	—	—	—	37	—	631	—
	20	—	11	—	—	—	4	—	35	—
	8	40,0	12	109,1	—	—	87	—	107	—
ИТОГО по гр. А	810	105,0	362	153,7	54	98,2	29	—	1275	145,6
Б. Транспортное хозяйство	851	—	587	—	53	—	366	—	1857	—
Ширококолейные пути:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
В т. ч. { А) под'ездные	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Б) заводские	300	31,3	—	—	—	—	—	—	300	31,3
Тарифная и товарн. контора	94	—	—	—	—	—	9	—	94	—
	50	—	61	—	—	—	—	—	120	—
Паровозное депо	55	—	44	9,1	—	—	1	—	100	4,0
	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—
Паровозы и вагоны	—	—	150	1,3	—	—	—	—	150	1,3
	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
Шоссе и мостовые до зав. и по заводу	150	21,3	—	—	—	—	—	—	150	21,3
	32	—	—	—	—	—	—	—	32	—
Электрокары и автомобили	—	—	10	—	—	—	—	—	10	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ИТОГО по гр. Б	555	23,4	265	2,3	—	—	10	—	830	16,4
	130	—	6	—	—	—	—	—	136	—
В. Общезавод. здан. и сооружения.	300	—	—	—	—	—	—	—	300	—
Управление заводом	7	2,3	—	—	—	—	—	—	7	2,3
Лаборатория	12	—	14	57,1	14	7,1	2	100,0	30	76,7
	—	—	8	—	1	—	2	—	23	—
Проходная и служба связи	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Заводский гараж	47	—	3	—	—	—	—	—	50	—
Телефоны	—	—	30	80,0	—	—	—	—	30	80,0
	—	—	24	—	—	—	—	—	24	—
Центральный магазин	2	—	7	—	—	—	1	—	10	—
Склад готовых изделий	—	—	37	—	—	—	3	—	40	60,0
	2	—	—	—	—	—	22	—	24	—
Склад горюч. материалов	—	—	28	—	—	—	2	—	30	—
Противопожарн. мероприятия	80	—	121	—	—	—	9	—	210	—
Заборы и благоустройство	150	134,0	—	—	—	—	—	—	150	134,0
	201	—	—	—	—	—	—	—	201	—
Канализация завода	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20	—	—	—	—	—	1	—	21	—
ИТОГО по гр. В	532	54,3	237	14,8	14	7,1	17	147,1	800	43,8
	289	—	35	—	1	—	25	—	350	—
ИТОГО по ст. III	1897	66,9	881	71,0	68	79,4	56	—	2905	80,7
	1270	—	628	—	54	—	391	—	2343	—

ПЛАН НА 1932 Г. И ВЫПОЛНЕНИЕ НА 1-ое ОКТЯБРЯ 1932 Г.														
Строит. работы			Оборудов. СССР			Оборудов. импорт.			Монтаж оборудов.			В с е г о		
План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.	План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.	План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.	План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.	План на 1932 г.	Вып. на 1-ое октября	% вып.
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
200	311	155,5	1800	570	31,7	94	—	—	275	121	44,0	2369	1002	42,3
320	—	—	185	—	—	—	—	—	20	—	—	525	—	—
680	899	132,2	860	321	37,3	52	—	—	137	171	124,8	1729	1391	80,4
50	8	16,0	400	26	6,5	—	—	—	60	155	258,3	510	189	37,1
2764	3236	117,1	5411	1800	33,3	805	254	31,6	876	1176	134,2	9856	6466	65,6
516	4	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	516	4	0,8
377	351	93,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	377	351	93,1
100	—	—	60	3	5,0	—	—	—	24	—	—	184	3	6,1
248	—	—	46	22	47,8	—	—	—	7	1	14,3	301	23	7,6
—	—	—	560	50	8,9	—	—	—	—	—	—	560	50	8,9
300	91	30,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300	91	30,3
—	—	—	141	31	22,0	—	—	—	—	—	—	141	31	22,0
1541	446	28,9	807	106	13,1	—	—	—	31	1	3,2	2379	553	23,2
642	215	33,5	185	—	—	—	18	—	—	2	—	827	230	27,8
30	20	66,7	100	32	32,0	215	3	1,4	40	27	67,5	385	82	21,3
76	—	—	165	—	—	18	—	—	17	—	—	271	—	—
168	332	197,6	17	6	35,3	—	—	—	—	—	—	185	338	182,7
—	—	—	319	66	20,7	—	—	—	—	—	—	319	66	20,7
22	—	—	110	17	15,5	—	—	—	10	7	70,0	142	24	16,9
100	343	343,0	75	39	52,0	69	—	—	13	74	—	257	456	177,4
198	18	6,6	65	3	4,6	—	—	—	2	4	200,0	265	20	7,5
261	—	—	413	—	—	—	—	—	10	—	—	684	—	—
478	210	43,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	478	210	43,9
338	250	74,0	20	1	5,0	—	—	—	2	1	50,0	360	252	70,0
2313	1383	59,8	1469	164	11,2	297	16	5,4	94	115	122,3	4173	1678	40,2
6018	5065	76,5	7887	2070	26,9	1102	270	24,5	1001	1292	129,1	16408	8697	53,0

Выполнение стройпрограммы по груп

(Числитель — план,

пам за 3 кварт. 1932 г. (в тыс. руб.).

знаменатель — выполнение).

Приложение № 2.

		И Ю Л Ь							
		Работы вы- полняем. непо- средственно группой		Раб. вып. др. организац.				ВСЕГО	
				ЦМК и МТУ. (изгот. и монт. мет. констр.)		Прочие			
1		Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%
		2	3	4	5	6	7	8	9
А. Промышленное строительство.		2113		669		1046		3828	
		1156	54,7	172	25,7	433	41,4	1761	46,0
В том числе:									
1 гр. Кузнечно-Прессовый цех, Новый ЦМК и др.		495		196		157		848	
		254	51,3	103	52,6	5	3,2	362	42,7
В т. ч. Кузнечно-Прессовый цех		382		196		94		672	
		220	57,6	98	50,0	2	2,1	320	47,6
2—3 гр. Механич. цех, Заводоуправл. и др.		652		473		479		1604	
		280	42,9	69	14,6	287	59,9	636	39,7
В т. ч. Механический цех		543		466		114		1123	
		197	36,3	65	13,9	88	77,2	350	31,2
4 гр. Электроотопит., Газогенераторная ст. и др.		190		—		99		280	
		184	96,8	—	—	62	62,6	246	85,1
6 гр. Санитарно-технические сооружения.		240		—		6		246	
		133	55,4	—	—	9	150,0	142	57,7
В т. ч. для Экскаваторстроя		38		—		—		38	
7 гр. Дорожное строительство :		411		—		—		411	
		276	67,2	—	—	—	—	276	67,2
В т. ч. для Экскаваторстроя		—		—		—		—	
„ „ друг. организаций		—		—		—		—	
		4		—		—		4	
9 гр. Постройка эстокады (на торфоразработ.)		125		—		—		125	
		29	23,2	—	—	—	—	29	23,2
Контора Востокотеплостроя		—		—		305		305	
		—	—	—	—	70	22,9	70	22,9
Б. Городское строительство.		2256		—		316		2572	
		942	41,8	—	—	58	18,4	1000	38,9
В том числе:									
1 гр. Жилые и обществен. здания		1075		—		247		1322	
		458	42,6	—	—	48	19,4	506	38,3
В т. ч. для друг. организаций		44		—		—		44	
		1	2,3	—	—	—	—	1	2,3
2 гр. Экскаваторстрой, Стройуч. и др.		410		—		12		422	
		227	55,4	—	—	—	—	227	53,8
В т. ч. для Экскаваторстроя		241		—		—		241	
		126	52,3	—	—	—	—	126	52,3
В т. ч. для друг. организаций		112		—		12		124	
		73	65,2	—	—	—	—	73	58,9

А В Г У С Т								С Е Н Т Я Б Р Ь								ВСЕГО выполнено за III квартал					
Работы вы- полняем. непо- средственно группой		Раб. вып. др. организац.				ВСЕГО		Работы вы- полняем. непо- средственно группой		Раб. вып. др. организац.				ВСЕГО		Работы вы- полняем. непо- сред. группой	Раб. вып. др. организац.				
		ЦМК и МТУ. (изгот. и монт. мет. констр.)		Прочие						ЦМК и МТУ (изгот. и монт. мет. констр.)		Прочие					ВСЕГО		ЦМК и МТУ (изгот. и монт. мет. констр.)		Прочие
Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%		Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2151	57,5	720	25,1	1052	32,1	3923	44,7	2099	61,9	611	39,1	1086	24,4	3796	50,2	3691	592	1037	5320		
1236		181		338		1755		1299		239		266		1804							
495	48,5	283	41,3	145	4,1	923	39,3	396	71,7	270	55,9	175	18,2	841	55,5	778	371	43	1192		
240		117		6		303		284		151		32		467							
394	53,6	271	41,3	95	2,1	760	42,8	368	67,4	270	47,0	158	17,0	796	50,5	679	337	31	1047		
211		112		2		325		248		127		27		402							
412	71,6	384	13,8	614	33,4	1410	39,2	305	111,2	321	23,3	305	32,1	931	55,0	914	197	590	1701		
295		53		205		553		339		75		98		512							
270	77,8	374	12,6	289	61,2	333	46,5	180	140,0	314	22,9	122	38,5	616	58,6	659	184	302	1145		
210		47		177		434		252		72		37		361							
383	60,3	48	22,9	97	76,3	528	59,8	545	32,3	6	216,0	245	24,0	796	31,2	591	24	195	810		
231		11		74		316		176		13		59		248							
232	71,5	4	—	3	—	239	69,5	236	62,3	14	—	29	—	279	52,7	446	—	9	455		
166		—		—		166		147		—		—		147							
26	73,1	—	—	—	—	26	73,1	16	112,5	—	—	—	—	16	112,5	37	—	—	37		
19		—		—		19		18		—		—		18							
462	58,9	1	—	—	—	463	58,7	531	59,1	—	—	127	12,5	658	50,2	862	—	16	878		
272		—		—		272		314		—		16		330							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	8		
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	12		
8		—		—		8		—		—		—		—							
167	19,2	—	—	—	—	167	19,2	86	45,3	—	—	—	—	86	45,3	100	—	—	100		
32		—		—		32		39		—		—		39							
—	—	—	—	193	27,5	193	27,5	—	—	—	—	205	29,8	205	29,8	—	—	184	184		
—		—		53		53		—		—		61		61							
1571	45,0	—	—	384	13,5	1955	38,8	1698	—	—	—	501	20,9	2199	27,6	2151	—	215	2366		
707		—		52		759		502		—		105		607							
804	56,7	—	—	119	22,7	923	52,3	1132	27,7	—	—	342	12,6	1474	24,2	1228	—	118	1346		
456		—		27		483		314		—		43		357							
94	3,2	—	—	—	—	94	3,2	10	10,0	—	—	1	—	11	9,1	5	—	—	5		
3		—		—		3		1		—		—		1							
540	33,1	—	—	—	—	540	33,1	329	36,5	—	—	52	3,8	381	32,0	526	—	2	528		
179		—		—		179		120		—		2		122							
441	29,0	—	—	—	—	441	29,0	296	33,1	—	—	52	3,8	348	28,7	352	—	2	354		
128		—		—		128		98		—		2		100							
99	51,5	—	—	—	—	99	51,5	33	66,7	—	—	—	—	33	66,7	146	—	—	146		
51		—		—		51		22		—		—		22							

		И Ю Л Ь							
		Работы вы- полняем. непо- средственно группой		Раб. вып. др. организац.				ВСЕГО	
				ЦМК и МТУ (изгот. и монт. мет. констр.)		Прочие			
		Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3 гр. Теплофикац. поселка и парк культ. и отдыха		120		—	—	—	—	120	
		21	17,5	—	—	—	—	21	17,5
В т. ч. для др. организаций		120		—	—	—	—	120	
		21	17,5	—	—	—	—	21	17,5
4 гр. Доделочн. работы по карк. домам		57		—	—	3	—	60	
		19	33,3	—	—	—	—	19	31,7
5 гр. Благоустройство		371		—	—	—	—	371	
		111	29,9	—	—	—	—	111	29,9
В т. ч. для Экскаваторстроя		54		—	—	—	—	54	
		60	111,1	—	—	—	—	60	111,1
6 гр. Монтажные работы.		223		—	—	—	—	223	
		106	47,5	—	—	—	—	106	47,5
В т. ч. для Экскаваторстроя		13		—	—	—	—	13	
		24	184,6	—	—	—	—	24	184,6
Тепломонтажные работы		—	—	—	—	54	18,5	54	18,5
		—	—	—	—	10	—	10	—
В. Строительные работы подсобн. предприятий.		149		—	—	—	—	149	
		36	24,2	—	—	4	—	37	24,8
ВСЕГО.		4518		669		1362		6549	
		2134	47,2	172	25,7	492	36,1	2798	42,7
В том числе:	для Уралмашиностроя	3771		669		1350		5790	
		1796	47,6	172	25,7	492	36,4	2460	42,5
	» Экскаваторстроя	346		—	—	—	—	346	
		210	60,7	—	—	—	—	210	60,7
	» других организаций	401		—	—	12		413	
		128	31,9	—	—	—	—	128	31,0

А В Г У С Т								С Е Н Т Я Б Р Ь								ВСЕГО выполнено за III квартал			
Работы вы- полняем. непо- средственно группой		Раб. вып. др. организац.				ВСЕГО		Работы вы- полняем. непо- средственно группой		Раб. вып. др. организац.				ВСЕГО		Работа вы- полняем. непо- сред. группой	Раб. вып. др. орган.		
		ЦМК и МТУ (изгот. и монт. мет. констр.)		Прочие						ЦМК и МТУ (изгот. и монт. мет. констр.)		Прочие					ЦМК и МТУ (изгот. и монт. мет. констр.)	Прочие	ВСЕГО
Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	26	27	28	29
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
61	8,2	—	—	154	9,7	215	9,3	3-я гр. расформирована, вошла в 1-ю гр. Горстр.								26	—	15	41
5	—	—	—	15	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	21
5	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	40,4	—	—	38	26,3	204	37,7	237	28,7	—	—	56	33,9	293	29,7	154	—	29	183
67	—	—	—	10	—	77	—	68	—	—	—	19	—	87	—	—	—	—	—
5 гр. расформирована, вошла в 7-ю группу Пром. стр-ва																111	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	60
6 гр. расформирована вошла в М. Т. У.				73	—	73	—	—	—	—	—	51	80,3	51	80,3	106	—	41	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10
140	45,0	—	—	—	—	140	45,0	124	63,7	—	—	—	—	124	63,7	178	—	1	179
63	—	—	—	—	—	63	—	79	—	—	—	—	—	79	—	—	—	—	—
3862	51,9	720	25,1	1436	27,2	6018	42,8	3921	47,9	611	39,1	1587	23,3	6119	40,7	6020	592	1253	7865
2006	—	181	—	320	—	2577	—	1880	—	239	—	371	—	2490	—	—	—	—	—
3080	58,0	720	25,1	1427	27,3	5177	45,0	3480	48,9	611	39,1	1534	24,1	5625	41,1	5255	592	1251	7098
1757	—	181	—	390	—	2328	—	1702	—	239	—	369	—	2310	—	—	—	—	—
467	33,2	—	—	—	—	467	33,2	312	37,2	—	—	52	3,8	364	32,4	481	—	2	483
155	—	—	—	—	—	155	—	116	—	—	—	2	—	118	—	—	—	—	—
365	25,7	—	—	9	—	374	25,1	129	48,1	—	—	1	—	130	47,7	284	—	—	284
94	—	—	—	—	—	94	—	62	—	—	—	—	—	62	—	—	—	—	—

Выполнение плана строительных работ в объемных величинах по промышленному строительству

За 3-ий квартал

Приложение № 3

1932 г.

№ п/п	Наименование работ	Едн. измерения	Июль						
			П л а н		Удельный вес в месячном плане	ВЫПОЛНЕНО		% выполнения от суммы	Удельный вес работ в общем выпол.
			Объем	Сметно-плановый стоим. (в т. р.)		Объем	Сметно-плановый стоим. (в т. р.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Земляные работы в плот. массе	м³	64413	318,1	8,31	50882	252,5	79,4	14,33
2	„ в рыхлой массе	„	19214	22,7	0,59	14406	16,5	72,7	0,93
3	Кладка из естеств. камней	„	1568	36,0	0,94	1299	30,1	83,6	1,71
4	„ из искусств. камней	м²	3279	40,6	1,06	1848	34,4	84,7	1,95
5	Кирпичная кладка	т. шт.	438	56,1	1,47	348	42,9	76,5	2,44
6	Кладка из огнеупорного кирпича	„	358,3	125,4	3,28	25	8,8	7,0	0,50
7	Укл. бетона: а) Бетон, ж/бетон	м³	11872	429,6	11,22	4534	169,5	39,4	9,62
	б) Буто-бетон	„	1170	35,1	0,92	12137	29,9	85,3	1,70
8	Опалубка (вкл. леса д/бет. раб.)	м²	44524	169,0	4,41	22889	77,0	52,1	4,37
9	Арматурные работы	тонн	367,5	105,1	2,75	161	46,9	44,6	2,66
10	Междуетаж. перекрытия	м²	1312	13,4	0,35	65	0,8	6,1	0,05
11	Дер. констр. (стр. фермы и проч.)	п. м.	6500	32,2	0,84	212	1,0	3,2	0,06
12	Крыша: а) Теплая кровля	м²	17919	166,3	4,35	2269	27,0	16,2	1,53
	б) Покр. кр. железом	„	18130	51,6	1,35	4658	26,1	50,5	1,48
	в) „ „ руберойдом	„	7080	14,5	0,38	10277	15,0	103,0	0,85
	г) Светов. фонари	„	7710	143,3	3,74	419	8,4	5,9	0,48
13	Стекольн. раб. (окон. пер., фонари)	„	9570	95,2	2,49	5839	55,1	57,9	3,13
14	Разные полы	„	8548	31,3	0,82	3677	13,0	41,4	0,73
15	Штукатурные работы	„	18763	30,0	0,78	24563	39,3	131,8	2,23
16	Малярные работы	„	52452	31,1	0,80	44500	26,0	83,4	1,47
17	Мет. констр. а) Изготовление	тонн	1400	518,0	13,53	314,3	116,0	22,4	6,58
	б) Монтаж	„	1887	151,0	3,94	554,6	56,0	97,1	3,18
18	Электро сварочные работы	т. руб.	—	—	—	—	—	—	—
19	Укладка ж/д. путей	„	—	133,2	3,48	—	44,6	33,5	2,53
20	Дорожно-мостов. работы	„	—	78,5	2,05	—	24,9	31,7	1,41
21	Асфальтов. работы	„	—	—	—	—	—	—	—
22	Отопление и вентиляция	„	—	461,0	12,04	—	241,0	52,3	13,68
23	Водопровод и канализация	„	—	134,8	3,53	—	87,0	64,6	4,94
24	Освещение	„	—	14,0	0,37	—	11,0	78,6	0,62
25	Все прочие работы	„	—	390,9	10,21	—	260,3	66,9	14,84
И т о г о		т. руб.	—	3828,0	100,0	—	1761,0	46,0	100,0

№ п/п	Наименование работ	Едн. измерения	Август							Сентябрь							Всего выполнено за кварт.		
			П л а н		Удельный вес в месячном плане	ВЫПОЛНЕНО		% выполнения от суммы	Удельный вес работ в общем выпол.	П л а н		Удельный вес в месячном плане	ВЫПОЛНЕНО		% выполнения от суммы	Удельный вес работ в общем выпол.	ВЫПОЛНЕНО		Удельный вес работ в общем выпол.
			Объем	Сметно-плановый стоим. (в т. р.)		Объем	Сметно-плановый стоим. (в т. р.)			Объем	Сметно-плановый стоим. (в т. р.)		Объем	Сметно-плановый стоим. (в т. р.)			Объем	Сметно-плановый стоим. (в т. р.)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	24	25	26
68702	355,2	9,05	51792	268,9	75,7	15,32	67294	345,6	9,10	46439	236,3	68,4	13,10	149113	757,7	14,24			
15380	25,0	0,64	22414	31,6	126,4	1,80	15635	28,5	0,75	17231	24,0	84,3	1,33	54051	72,1	1,36			
1315	27,3	0,70	1050	24,1	88,4	1,38	2815	28,9	0,76	166	3,8	13,2	0,21	2515	58,0	1,09			
4030	78,3	2,00	1348	24,1	30,8	1,37	3495	62,0	1,63	1560	29,9	48,3	1,66	4756	88,4	1,66			
1,8	0,2	—	51	6,3	—	0,36	237	41,1	1,08	45	7,2	17,4	0,40	444	56,4	1,06			
—	—	—	—	—	—	—	592,5	68,7	1,81	41,7	15,4	22,4	0,86	66,7	24,2	0,46			
10522	389,2	9,92	4607	182,1	46,8	10,38	10783	427,4	11,26	5586	236,5	55,3	13,11	14727	588,1	11,05			
1756	42,2	1,08	352	8,7	20,5	0,49	1897	43,8	1,15	260	6,5	14,7	0,36	1826	45,1	0,85			
38869	127,6	3,25	17179	61,6	48,3	3,51	52534	168,3	4,43	19911	69,4	41,2	3,85	59979	208,0	3,91			
605	139,9	3,56	203	48,6	34,7	2,77	813	258,2	6,80	127	30,2	11,7	1,67	491	125,7	2,36			
1078	11,4	0,29	—	—	—	—	300	3,9	0,10	—	—	—	—	65	0,8	0,02			
6800	33,4	0,85	976	4,0	12,1	0,23	100	2,9	0,08	—	—	—	—	1188	5,0	0,02			
13403	141,2	3,60	5637	65,7	46,5	3,74	8990	102,3	2,70	6590	79,4	77,6	4,40	14496	172,1	3,24			
12760	27,0	0,69	4848	14,2	52,7	0,81	7730	17,1	0,45	4318	10,7	61,7	0,59	13824	51,0	0,96			
1560	3,7	0,09	4840	9,6	258,8	0,55	1560	3,7	0,10	900	1,9	51,3	0,10	15917	26,5	0,50			
4983	114,5	2,92	603	13,9	12,1	0,79	3738	86,0	2,27	2832	65,4	76,0	3,62	3854	87,7	1,65			
10268	92,3	2,35	5010	39,2	42,4	2,23	13450	108,1	2,85	7283	65,3	60,4	3,62	18132	159,6	3,00			
5183	24,0	0,61	2318	7,4	31,1	0,42	6500	30,0	0,79	3898	21,1	60,4	1,17	9893	41,5	0,78			
14660	23,9	0,61	19908	30,4	127,3	1,73	10075	16,0	0,42	19382	28,3	177,1	1,57	63853	98,0	1,84			
46053	18,1	0,46	62751	37,3	205,7	2,13	35090	14,7	0,39	37213	18,4	125,3	1,02	144464	81,7	1,54			
1430,0	529,0	13,48	396,5	147,0	27,8	8,38	893	460,0	12,12	309	156,0	33,9	8,65	1020	419,0	7,88			
172,5	138,0	3,52	433,0	34,0	24,6	1,04	1255	113,0	2,98	888	80,0	70,8	4,43	1876	170,0	3,20			
—	53,0	1,35	—	—	—	—	—	38,0	1,00	—	3,0	7,9	0,17	—	3,0	0,06			
—	66,7	1,70	—	34,5	51,7	1,93	—	132,9	3,50	—	83,9	63,1	4,65	—	163,0	3,06			
—	151,9	3,87	—	92,1	60,6	5,25	—	244,1	6,44	—	83,2	34,1	4,61	—	200,2	3,76			
—	29,3	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	575,0	14,66	—	221,0	38,4	12,59	—	462,0	12,17	—	121,0	26,2	6,71	—	583,0	10,96			
—	152,3	3,89	—	84,7	55,6	4,83	—	173,3	4,55	—	70,8	40,9	3,93	—	242,5	4,56			
—	51,0	1,30	—	9,0	17,6	0,51	—	39,0	1,13	—	24,0	61,5	1,33	—	44,0	0,83			
—	502,4	12,81	—	255,0	50,8	14,53	—	276,5	7,19	—	232,4	71,8	12,88	—	747,7	14,10			
—	8923,0	100,0	—	1755,0	44,7	100,0	—	3796,0	100,0	—	1804,0	47,5	100,0	—	5320,0	100,0			

Выполнение стройпрограммы в 3-м квартале 1932 г.

(Числитель — план,

по видам строит. работ (по месяцам). *)

знаменатель — выполнение).

Приложение № 4.

Объекты	И Ю Л Ъ								А В Г У С Т								С Е Н Т Я Б Р Ъ							
	Всего строит. работ		В том числе:						Всего строит. работ		В том числе:						Всего строит. работ		В том числе:					
			Чисто-строит. работы		Металлич. конструкции		Спец.-строит. работы по монтажу обо- рудование				Чисто-строит. работы		Металлич. конструкции		Спец.-строит. работы по монтажу обо- рудование				Чисто-строит. работы		Металлич. конструкции		Спец.-строит. работы по монтажу обо- рудование	
	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Механический цех № 1	1123 351	31,3	577 226	39,2	466 65	13,9	80 60	75,0	933 434	46,5	503 319	63,4	373 47	12,6	57 68	119,3	616 361	58,6	271 241	88,9	313 72	23,0	32 48	150,0
Чугуннолитейный цех	20 68	—	12 67	—	2 1	50,0	6 —	—	85 28	32,9	79 24	30,4	— —	— —	6 4	66,7	59 26	44,1	58 13	22,4	— 1	— —	1 12	—
Сталелитейный цех	157 58	36,9	102 49	48,0	5 2	40,0	50 7	14,0	129 55	42,6	127 40	31,5	2 6	— —	— 9	—	66 40	75,8	66 38	57,6	— —	— —	— 2	—
Кузнечно-прессовый цех	937 370	39,5	282 77	27,3	196 98	50,0	459 195	42,5	918 355	38,7	378 126	33,3	262 112	42,7	278 117	42,1	1001 419	41,9	369 159	43,1	260 124	47,7	372 136	36,6
Термический цех № 1	44 69	156,8	44 52	118,2	— 1	—	— 16	—	78 22	28,2	48 1	2,1	— —	— —	30 21	70,0	10 34	—	10 2	50,0	— 2	— —	— 30	—
„ „ № 2	6 10	166,7	6 10	166,7	—	—	—	—	222 82	36,9	204 82	40,2	— —	— —	18 —	—	440 37	8,4	396 37	9,3	— —	— —	44 —	—
Цех металлических конструкций	176 42	23,9	176 37	21,0	— 5	—	—	—	146 34	23,3	141 29	20,6	— 5	— —	5 —	—	45 65	144,4	45 41	91,1	— 24	— —	— —	—
Электроотопительная станция	85 88	103,5	80 86	107,5	—	—	5 2	40,0	106 98	82,5	93 93	100,0	— 2	— —	13 3	23,1	96 79	82,3	59 54	91,5	— 3	— —	37 22	59,5
Газогенераторная станция	175 135	77,1	140 116	82,9	—	—	35 19	54,3	124 113	91,1	102 102	100,0	— 5	— —	22 6	27,3	140 81	57,9	114 53	46,5	— 2	— —	26 26	100,0
Канализ. газа (газопров. до зданий)	—	—	—	—	—	—	—	—	30 —	—	—	—	30 —	— —	— —	— —	— 8	—	—	—	— 8	— —	— —	—
Канализ. энергии по заводу	15 9	60,0	15 9	60,0	—	—	—	—	110 31	28,2	110 27	24,5	— 4	— —	— —	— —	170 87	51,2	170 87	51,2	— —	— —	— —	—
Фабзавуч	17 —	—	16 —	—	—	—	1 —	—	15 —	—	15 —	—	— —	— —	— —	— —	10 —	—	10 —	—	— —	— —	— —	—
Итого	2755 1200	43,6	1450 729	50,3	669 172	25,7	636 299	47,0	2896 1252	43,2	1800 843	46,8	667 181	27,1	429 228	53,1	2653 1237	46,6	1568 725	46,2	573 236	41,2	512 276	53,9

*) В таблицу включены только те объекты, по которым, кроме чисто-строит. работ, велись также работы по

установке металлоконструкций и спец.-строит. работы.

Использование механизмов в 3-м квартале

по пром. и городскому стр-ву 1932 года.

1		Колич. механизмов					Возможное число часов работы	Фактическое число часов работы	% использо- вания механизмов по времени
		Всего	Из них было:						
			В работе	В ре- монте	В консе- рации	В про- кате			
		2	3	4	5	6	7	8	9
Бетономешалки	Июль	36	22	5	8	1	5498	2019	36,7
	Август	36	17	3	15	1	4277	1608	37,6
	Сентябрь	36	24	2	9	1	5702	2135	37,4
	Итого	36,0	21,0	3,3	10,7	1,0	15477	5762	37,2
Растворомешалки	Июль	22	8	4	4	6	1286	462	35,9
	Август	22	8	4	2	8	1595	835	52,4
	Сентябрь	22	9	4	1	8	1694	643	38,0
	Итого	22,0	8,3	4,0	2,3	7,3	4575	1940	42,4
Бамедробилки	Июль	6	4	—	2	—	1000	208	20,8
	Август	6	1	1	2	2	240	95	39,6
	Сентябрь	6	1	1	2	2	170	53	31,2
	Итого	6,0	2,0	0,7	2,0	1,3	1410	356	25,2
Краны „Ибаг“	Июль	4	2	—	1	1	260	250	96,2
	Август	4	—	—	3	1	Не работали за отсут-		
	Сентябрь	4	1	—	2	1	250	110	44,0
	Итого	4,0	1,0	—	2,0	1,0	510	360	70,6
Краны „Норд-Вест“	Июль	3	3	—	—	—	1398	757	54,2
	Август	3	3	—	—	—	1186	846	71,3
	Сентябрь	3	3	—	—	—	1286	696	56,3
	Итого	3,0	3,0	—	—	—	3820	2299	60,2
Краны „Бенар“	Июль	6	4	1	1	—	1090	708	65,0
	Август	6	4	—	2	—	829	402	48,5
	Сентябрь	6	3	—	3	—	462	220	47,6
	Итого	6,0	3,7	0,3	2,0	—	2381	1330	55,9
Паровые краны	Июль	2	2	—	—	—	547	367	67,1
	Август	2	2	—	—	—	248	113	45,6
	Сентябрь	2	2	—	—	—	476	363	76,3
	Итого	2,0	2,0	—	—	—	1271	843	66,3
Экскаваторы „Межк“	Июль	2	2	—	—	—	972	506	52,1
	Август	2	2	—	—	—	982	554	56,4
	Сентябрь	2	2	—	—	—	844	510	60,4
	Итого	2,0	2,0	—	—	—	2798	1570	56,1

Простои (в часах)																Коэффициент интенсивности механизмов	Коэффициент эксплуатации механизмов
Всего	В том числе по причинам																
	Отсутств. материала		Отсутств. энергии		Отсутств. рабсилы		Не требовал. продукции		Неисправн. механизмов		Прочие простои						
Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
3479	63,3	64	1,1	49	0,9	20	0,4	3336	60,7	—	—	10	0,2	0,93	0,85		
2669	62,4	327	7,6	196	4,6	12	0,3	2026	47,4	99	2,3	9	0,2	0,41	0,15		
3567	62,6	448	7,9	68	1,2	942	16,5	1903	33,4	91	1,6	115	2,0	0,41	0,15		
9715	62,8	839	5,4	313	2,0	974	6,3	7265	47,0	190	1,2	134	0,9	0,59	0,22		
824	64,1	116	9,0	84	6,5	63	4,9	385	29,9	25	2,0	151	11,8	0,62	0,22		
760	47,6	158	9,9	90	5,6	58	3,6	437	27,4	17	1,1	—	—	0,76	0,40		
1051	62,0	279	16,5	127	7,5	149	8,8	415	24,5	38	2,2	43	2,5	0,76	0,29		
2635	57,6	553	12,1	301	6,6	270	5,9	1237	27,1	80	1,7	194	4,2	0,72	0,30		
792	79,2	4	0,4	12	1,2	10	1,0	766	76,6	—	—	—	—	—	—		
145	60,4	—	—	—	—	—	—	79	32,9	66	27,5	—	—	—	—		
117	68,8	10	5,9	—	—	60	35,3	—	—	47	27,6	—	—	—	—		
1054	74,8	14	1,0	12	0,9	70	5,0	845	59,9	113	8,0	—	—	—	—		
10	3,8	—	—	—	—	—	—	10	3,8	—	—	—	—	—	—		
в том числе в дни надобности																	
140	56,0	10	4,0	—	—	—	—	130	52,0	—	—	—	—	—	—		
150	29,4	10	2,0	—	—	—	—	140	27,4	—	—	—	—	—	—		
641	45,8	—	—	7	0,5	7	0,5	385	27,5	52	3,7	190	13,6	—	—		
340	28,7	4	0,3	20	1,7	8	0,7	224	18,9	46	3,9	38	3,2	0,69	0,49		
540	43,7	2	0,2	14	1,1	35	2,8	306	24,8	102	8,2	81	6,6	0,42	0,20		
1521	39,8	6	0,2	41	1,1	50	1,3	915	23,9	200	5,2	309	8,1	—	—		
382	35,0	—	—	4	0,4	—	—	378	34,6	—	—	—	—	—	—		
427	51,5	—	—	2	0,2	—	—	425	51,3	—	—	—	—	—	—		
242	52,4	4	0,9	2	0,4	16	3,5	188	40,7	—	—	32	6,9	—	—		
1051	44,1	4	0,2	8	0,3	16	0,7	991	41,6	—	—	32	1,3	—	—		
180	32,9	—	—	—	—	—	—	25	4,6	50	9,1	105	19,2	—	—		
135	54,4	2	0,8	3	1,2	—	—	101	40,7	29	11,7	—	—	—	—		
113	23,7	—	—	—	—	—	—	13	2,7	96	20,2	4	0,8	—	—		
428	33,7	2	0,2	3	0,2	—	—	139	10,9	175	13,8	109	8,6	—	—		
466	47,9	—	—	—	—	20	2,0	282	29,0	30	3,1	134	13,8	—	—		
428	43,6	—	—	86	8,8	—	—	195	19,8	42	4,3	105	10,7	0,71	0,40		
934	39,6	—	—	110	13,0	4	0,5	75	8,9	123	14,6	22	2,6	0,88	0,52		
1228	43,9	—	—	196	7,0	24	0,9	552	19,7	195	7,0	261	9,3	—	—		

Б. 1435760

1		Колич. механизмов					Возможное число часов работы	Фактическое число часов работы	% использо- вания механизмов по времени
		Всего	Из них было:						
			В работе	В ре- монте	В консе- рвации	В про- кате			
		2	3	4	5	6	7	8	9
Экскаватор „Остин“	Июль	1	1	—	—	—	356	68	19,1
	Август	1	1	—	—	—	240	92	38,3
	Сентябрь	1	1	—	—	—	435	207	47,6
	Итого	1,0	1,0	—	—	—	1031	367	35,6
Мотовозы	Июль	8	3	—	5	—	1112	592	53,2
	Август	8	3	4	1	—	1576	711	45,1
	Сентябрь	8	4	3	—	1	1214	720	59,3
	Итого	8,0	3,3	2,3	2,0	1,3	3902	2023	51,8
Транспортеры	Июль	29	13	2	12	2	2592	1280	49,4
	Август	29	13	2	9	5	1712	658	38,4
	Сентябрь	29	11	—	13	5	1205	594	49,3
	Итого	29,0	12,3	1,3	11,3	4,0	5509	2532	46,0
Цемент-пушки	Июль	4	3	1	—	—	606	232	38,3
	Август	4	1	—	2	1	343	211	61,5
	Сентябрь	3	1	—	1	1	40	2	5,0
	Итого	3,7	1,7	0,3	1,0	0,7	989	445	45,0
Бомпрессора	Июль	24	8	3	5	8	4552	1374	30,2
	Август	24	11	3	2	8	5248	1833	34,9
	Сентябрь	24	13	4	—	7	4562	1379	30,2
	Итого	24,0	10,7	3,3	2,3	7,7	14362	4586	32,0
Станки финской стружки	Июль	2	2	—	—	—	226	169	74,8
	Август	2	1	—	1	—	894	332	37,1
	Сентябрь	2	—	—	1	1	Не работали за отсут-		
	Итого	2,0	1,0	—	0,7	0,3	1120	501	44,7
Шпалорезные станки	Июль	6	2	—	4	—	546	355	65,0
	Август	7	1	—	3	3	90	9	10,0
	Сентябрь	7	2	—	2	3	728	389	53,4
	Итого	6,7	1,7	—	3,0	2,0	1364	753	55,2
Циркулярные пилы	Июль	13	7	—	5	1	2456	672	27,4
	Август	11	9	1	1	—	2557	793	31,0
	Сентябрь	11	10	—	1	—	3508	1028	29,3
	Итого	11,7	8,7	0,3	2,3	0,3	8521	2493	29,2
Итого по всем механизмам	Июль	168	86	16	47	19	24497	10019	40,9
	Август	167	77	18	43	29	22017	9092	41,3
	Сентябрь	166	87	14	35	30	22526	9049	40,3
	Итого	167	83	16	42	26	69040	28160	40,8

Просто и (в часах)															
Всего		В том числе по причинам												Коэффициент интенсивности механизмов	Коэффициент эксплуатации механизмов
		Отсутств. материала		Отсутств. энергии		Отсутств. рабсилы		Не требовал продукции		Неисправн. механизмов		Прочие простой			
Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
288	80,9	—	—	—	—	29	8,2	251	70,5	8	2,2	—	—	0,56	0,10
148	61,7	—	—	—	—	—	—	131	54,6	7	2,9	10	4,2	0,45	0,17
228	52,4	—	—	15	3,4	26	6,0	73	16,8	92	21,1	22	5,1	0,51	0,23
664	64,4	—	—	15	1,5	55	5,3	455	44,1	107	10,4	32	3,1	0,51	0,18
520	46,8	—	—	—	—	—	—	430	38,7	46	4,1	44	4,0	—	—
865	54,9	—	—	15	1,0	97	6,1	610	38,8	136	8,6	7	0,2	—	—
494	40,7	9	0,7	1	—	190	15,7	183	15,1	41	3,4	70	5,8	—	—
1879	48,2	9	0,2	16	0,4	287	7,4	1223	31,4	223	5,7	121	3,1	—	—
1312	50,6	10	0,4	57	2,2	189	7,3	853	32,9	23	0,9	180	6,9	—	—
1054	61,6	23	1,3	40	2,3	476	27,8	485	28,3	21	1,2	9	0,5	—	—
611	50,7	36	3,0	41	3,4	246	20,4	182	15,1	31	2,6	75	6,2	—	—
2977	54,0	69	1,3	138	2,5	911	16,5	1520	27,6	75	1,4	264	4,7	—	—
374	61,7	42	6,9	19	3,1	—	—	287	47,4	5	0,8	21	3,5	1,02	0,39
132	38,5	23	0,7	11	3,2	8	2,3	—	—	8	2,3	82	24,0	1,31	0,81
38	95,0	—	—	—	—	—	—	38	95,0	—	—	—	—	—	—
544	55,0	65	6,6	30	3,0	8	0,8	325	32,9	13	1,3	103	10,4	—	—
3178	69,8	—	—	—	—	—	—	2828	62,1	17	0,4	333	7,3	—	—
3415	65,1	2	—	34	0,6	15	0,3	3265	62,3	73	1,4	26	0,5	—	—
3183	69,8	42	0,9	7	0,2	87	1,9	2849	62,5	134	2,9	64	1,4	—	—
9776	68,0	44	0,3	41	0,3	102	0,7	8942	62,3	224	1,5	423	2,9	—	—
57	25,2	2	0,9	2	0,9	32	14,1	16	7,1	5	2,2	—	—	—	—
562	62,9	—	—	11	1,2	238	26,7	86	9,6	227	25,4	—	—	—	—
ствием надобности															
619	55,3	2	0,1	13	1,2	270	24,1	102	9,2	232	20,7	—	—	—	—
191	35,0	7	1,3	8	1,5	120	22,0	44	8,0	—	—	12	2,2	—	—
81	90,0	—	—	—	—	81	90,0	—	—	—	—	—	—	—	—
339	46,6	24	3,3	17	2,3	180	24,7	61	8,4	47	6,5	10	1,4	—	—
611	44,8	31	2,3	25	1,8	381	27,9	105	7,7	47	3,4	22	1,7	—	—
1784	72,6	503	20,5	90	3,7	828	33,7	254	10,3	28	1,1	81	3,3	—	—
1764	69,0	35	1,4	5	0,2	1261	49,3	186	7,3	276	10,8	1	—	—	—
2480	70,7	556	15,9	14	0,4	1492	42,5	208	5,9	94	2,7	116	3,3	—	—
6028	70,8	1094	12,9	109	1,3	3581	42,0	648	7,6	398	4,7	198	2,3	—	—
14478	59,1	748	3,0	332	1,4	1318	5,4	10530	43,0	289	1,2	1261	5,1	—	—
12925	58,7	574	2,6	513	2,3	2254	10,2	8250	37,5	1047	4,8	287	1,3	—	—
13477	59,8	1420	6,3	416	1,8	3427	15,2	6624	29,4	936	4,2	654	2,9	—	—
40880	59,2	2742	4,0	1261	1,8	6999	10,1	25404	36,8	2272	3,3	2202	3,2	—	—

Выполнение плана монтажных работ В 3-м квартале

Объекты		Электро-монтаж.			Механическ. монтаж.		
		План.	Вып.	%	План.	Вып.	%
		1	2	3	4	5	6
Механический цех № 1	Сумма . .	109704	81962	74,7	472899	451714	95,5
	Чел. дней	7116	4997	70,2	22733	17320	76,2
" " № 2	Сумма . .	37912	24825	65,5	—	—	—
	Чел. дней	2347	1342	57,2	—	—	—
Чугуннолитейный цех	Сумма . .	35153	15564	44,3	66659	40794	61,2
	Чел. дней	2598	1035	39,8	3825	3106	81,2
Сталелитейный цех	Сумма . .	16120	13217	82,0	77941	38923	49,9
	Чел. дней	1135	596	52,5	4322	2499	57,8
Кузнечно-прессовый цех	Сумма . .	16969	12082	67,2	351882	203544	57,8
	Чел. дней	1053	579	55,0	12243	7269	59,3
Термический цех	Сумма . .	27017	12912	47,8	68688	25707	37,4
	Чел. дней	1713	798	46,6	4455	1680	37,7
Цех металлических конструкций	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Модельный цех	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Инструментальный цех	Сумма . .	3968	161	4,1	743	790	106,3
	Чел. дней	229	5	2,2	37	64	172,9
Ремонтно-механич. цех	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Ремонтно-строит. цех	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Электроотопит. станция	Сумма . .	156953	138521	88,3	132664	81982	61,8
	Чел. дней	9847	5669	57,6	8764	5797	66,1
Газогенераторная станция	Сумма . .	31501	22174	70,4	35196	23222	66,0
	Чел. дней	1981	1516	76,5	2036	1638	80,4
Промышленный водопровод	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Тоннель	Сумма . .	26928	18672	69,4	—	—	—
	Чел. дней	1204	431	35,8	—	—	—
Кабельная сеть по заводу	Сумма . .	31630	20984	66,3	—	—	—
	Чел. дней	2819	1568	55,6	—	—	—
Газопровод	Сумма . .	560	—	—	110712	92840	83,8
	Чел. дней	30	—	—	5121	4291	83,8
Лаборатория	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Поселковый тепловод	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Фабзавуч	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Бетонный завод	Сумма . .	—	—	—	—	—	—
	Чел. дней	—	—	—	—	—	—
Разные работы	Сумма . .	139519	102617	73,5	5271	2028	38,4
	Чел. дней	7219	2931	40,6	323	176	52,6
Итого	Сумма . .	633934	463691	73,1	1322655	961544	72,7
	Чел. дней	39291	21467	54,6	63859	43834	68,6


МОНТАЖНО-ТЕХНИЧЕСКИМ управлением

1932 г.

Водопровод и канализация.			Тепломонтаж.			В с е г о .		
План.	Вып.	%	План.	Вып.	%	План.	Вып.	%
8	9	10	11	12	13	14	15	16
63835	5596	8,8	314025	249080	79,3	960463	788352	82,1
1118	99	8,4	10047	4544	45,2	41014	26930	65,7
224	225	100,1	8467	756	8,9	46603	25806	55,4
6	9	150	505	43	8,5	2858	1394	48,8
9906	14618	147,5	93100	51040	54,8	204818	122016	59,6
222	416	187,3	2832	812	28,7	9477	5369	56,7
17854	27896	156,1	172460	115	0,1	284375	80141	28,2
180	442	245,5	4574	5	0,1	10211	3542	34,7
—	—	—	86800	29231	33,7	455651	244857	53,7
—	—	—	5152	1229	23,8	18448	9077	49,2
—	178	—	58380	46588	79,8	154085	85385	55,4
—	5	—	1442	1192	82,6	7610	3675	48,3
—	282	—	—	1520	—	—	1802	—
—	26	—	—	112	—	—	138	—
—	—	—	78752	23450	29,8	78752	23450	29,8
—	—	—	2134	586	27,4	2134	586	27,5
—	585	—	4210	—	—	8921	1536	17,2
—	31	—	96	—	—	362	100	27,6
—	—	—	4793	3621	75,5	4793	3621	75,5
—	—	—	106	99	93,4	106	99	93,3
248	284	114,5	—	580	—	248	864	—
15	11	73,3	—	54	—	15	65	—
2391	4051	169,4	36180	28447	78,6	328188	253001	77,1
143	236	165,0	1124	615	54,7	19878	12317	62,0
—	130	—	67583	45330	67,1	134280	90856	67,6
—	2	—	1991	592	29,7	6008	3748	62,4
9982	1200	12,0	3350	3350	100,0	13332	4550	34,1
555	52	9,3	75	75	100,0	630	127	20,2
—	—	—	114840	52045	45,3	141768	70717	49,9
—	—	—	6113	2267	37,0	7317	2698	36,9
—	—	—	—	—	—	31630	20984	66,3
—	—	—	—	—	—	2819	1568	55,6
—	—	—	—	—	—	111272	92840	83,4
—	—	—	—	—	—	5151	4291	83,3
—	86	—	14340	1400	9,7	14340	1486	10,4
—	10	—	326	16	4,9	326	26	8,0
—	—	—	173444	22201	12,9	173444	22201	12,3
—	—	—	6695	1348	20,0	6695	1348	20,0
—	—	—	15500	—	—	15500	—	—
—	—	—	352	—	—	352	—	—
—	270	—	—	—	—	—	270	—
—	26	—	—	—	—	—	26	—
12944	13852	107,0	473175	122979	26,0	630909	241476	38,3
469	499	106,3	16760	3603	21,5	24771	7203	28,9
117384	69243	59,0	1719399	681733	39,6	3793372	2176211	57,4
2703	1864	68,9	60324	17192	28,5	166182	84357	50,8


**Выполнение плана работ
группами и конторами Монтажно-техническ. управления
в 3 квартале 1932 года**

	И ю л ь			А в г у с т			С е н т я б р ь			Итого за 3 кварт.			
	План	Вып.	%	План	Вып.	%	План	Вып.	%	План	Вып.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Монтажи. контора Энергоуст.													
а) Электроотопит. станция . . .	Сумма	43014	28312	65,8	42980	25072	58,3	46670	27256	58,4	132664	80640	60,8
	ч.-дн.	3039	2081	68,4	2760	1743	56,3	2965	1957	66,0	8764	5781	65,9
б) Тепломонтажн. группа . . .	Сумма	86076	28228	32,8	164424	33746	20,5	164788	67865	41,1	415288	129839	31,1
	ч.-дн.	5806	1970	33,9	3455	2061	59,6	8317	3336	40,2	17578	7367	26,7
в) Газогенераторн. станц. . . .	Сумма	18632	10816	58,1	7505	5299	70,6	9059	5481	60,5	35196	21596	61,3
	ч.-дн.	937	652	69,6	584	430	73,6	581	528	90,8	2102	1610	76,5
г) Газопровод	Сумма	21746	19844	91,3	17364	16551	95,4	71602	56445	78,8	110712	92840	83,8
	ч.-дн.	1879	1665	88,6	1425	1318	92,5	1825	1287	70,5	5129	4270	83,2
2. Проектно-монт. конт. электр. (монтаж) . . .	Сумма	142704	108966	76,3	177000	149397	84,8	318966	239733	76,4	633670	498096	78,6
	ч.-дн.	9738	7420	76,2	10439	8802	84,3	19474	7646	39,3	39651	23868	60,2
3. „ „ (эксплоат.)	Сумма	151737	160126	105,5	307000	211228	68,8	158000	102097	64,6	616737	473451	76,2
	ч.-дн.	3727	3752	100,7	10876	7505	69,0	3325	3752	112,8	17928	15009	83,7
4. Водопровод. эксплуат. гр. . . .	Сумма	45718	55974	122,4	34550	13141	38,1	37120	11755	31,6	117388	80870	68,8
	ч.-дн.	1113	1379	123,9	823	390	47,4	841	533	63,4	2777	2302	82,9
5. Ремонтно—механич. цех	Сумма	29415	14302	48,6	24865	14018	56,4	20280	15006	74,0	74560	43326	58,1
	ч.-дн.	5688	2992	52,6	4950	2829	57,2	4050	2270	56,0	14688	8091	55,0
6. Ремонтно—сварочн. группа . . .	Сумма	71686	50772	70,8	59965	59273	98,8	73847	77225	104,6	205498	187270	91,1
	ч.-дн.	2330	2542	109,1	2522	2954	117,2	3144	2507	79,7	7996	8003	100,1
7. Монт. группа механ. цеха . . .	Сумма	139929	146610	104,8	103000	114543	111,2	139687	163831	117,3	382616	424984	111,0
	ч.-дн.	7682	7660	99,8	4930	4273	86,7	3638	2753	75,7	16250	14686	90,3
8. „ „ тран.—под'ем. соор. . .	Сумма	57256	53826	94,0	74906	57138	76,3	68054	50640	74,4	200216	161604	53,8
	ч.-дн.	4534	4634	102,2	4503	3930	87,3	4847	3390	69,9	13884	11954	50,0
9. „ „ литейных цехов . . .	Сумма	37737	18279	48,4	39853	16730	41,9	40200	18165	45,2	117790	53174	45,1
	ч.-дн.	2629	1443	54,9	1819	1058	58,2	1946	1021	52,5	6394	3522	55,0
10. „ „ кузн.—пресе. цеха . . .	Сумма	74375	42535	57,2	188413	113547	60,3	90962	55986	61,5	353750	212068	59,9
	ч.-дн.	2760	2580	93,5	5239	3061	58,6	3904	2248	57,6	11903	7889	66,2
Всего . . .	Сумма	320025	738590	80,3	1241825	829683	66,8	1234235	891485	72,2	3396085	2459758	72,7
	ч.-дн.	51862	40770	78,6	54325	40354	74,3	58857	33228	56,5	165044	114352	69,2
Кроме того Госсантехстрой	Сумма	152248	255630	167,9	535000	215560	40,3	241000	80210	33,3	928248	551400	49,4

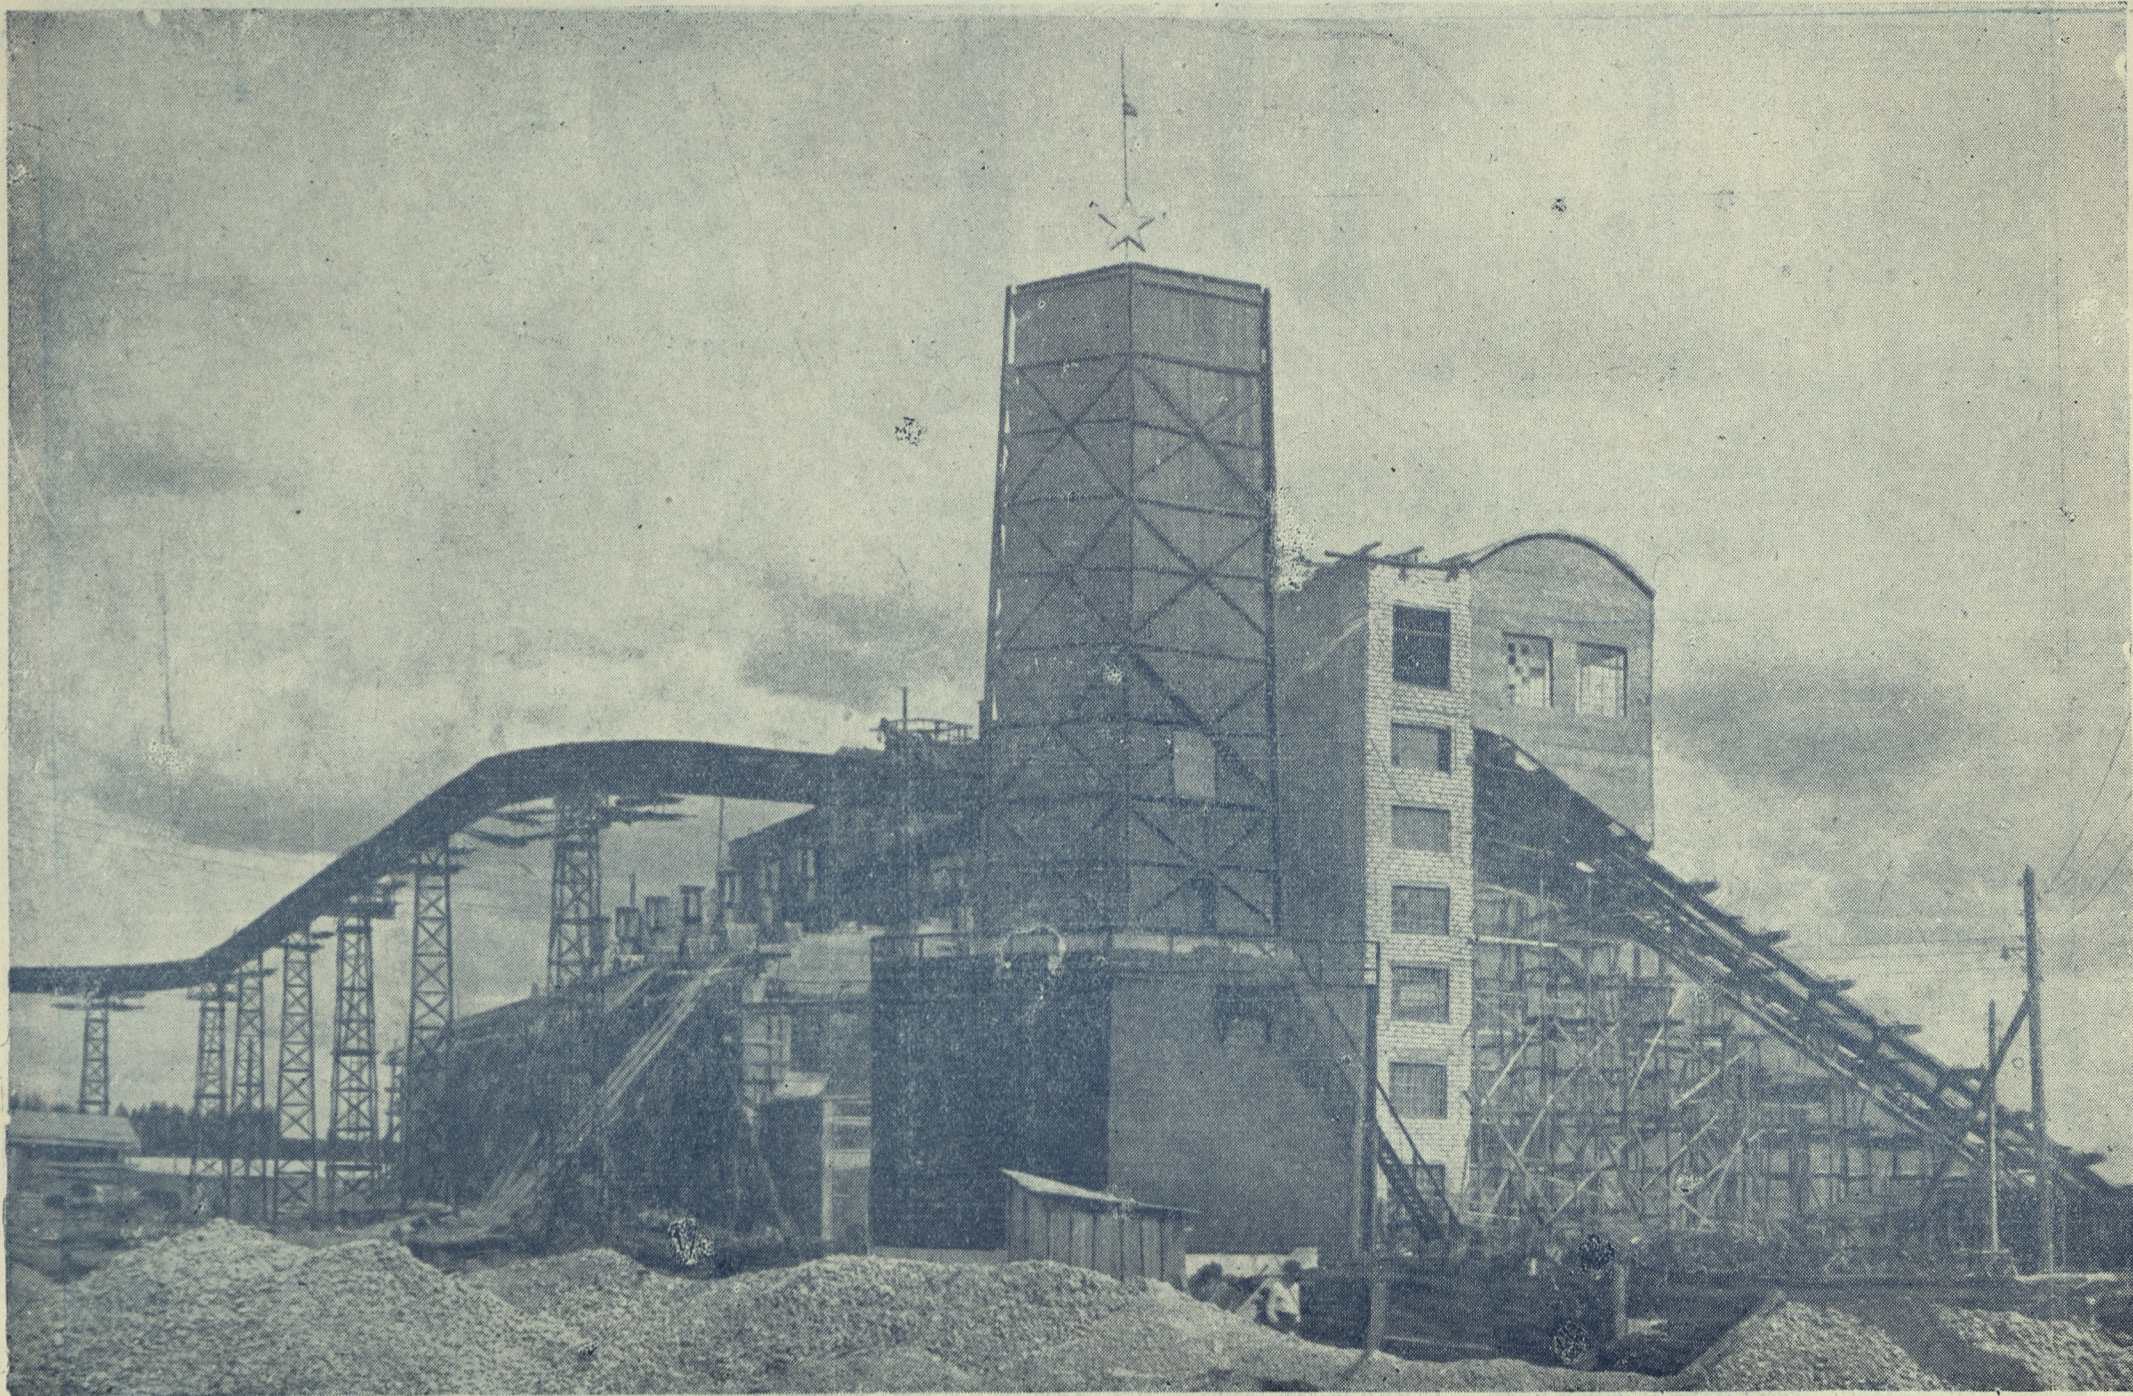

Газогенераторная станция.

Прогноз на 1950 г. в СССР

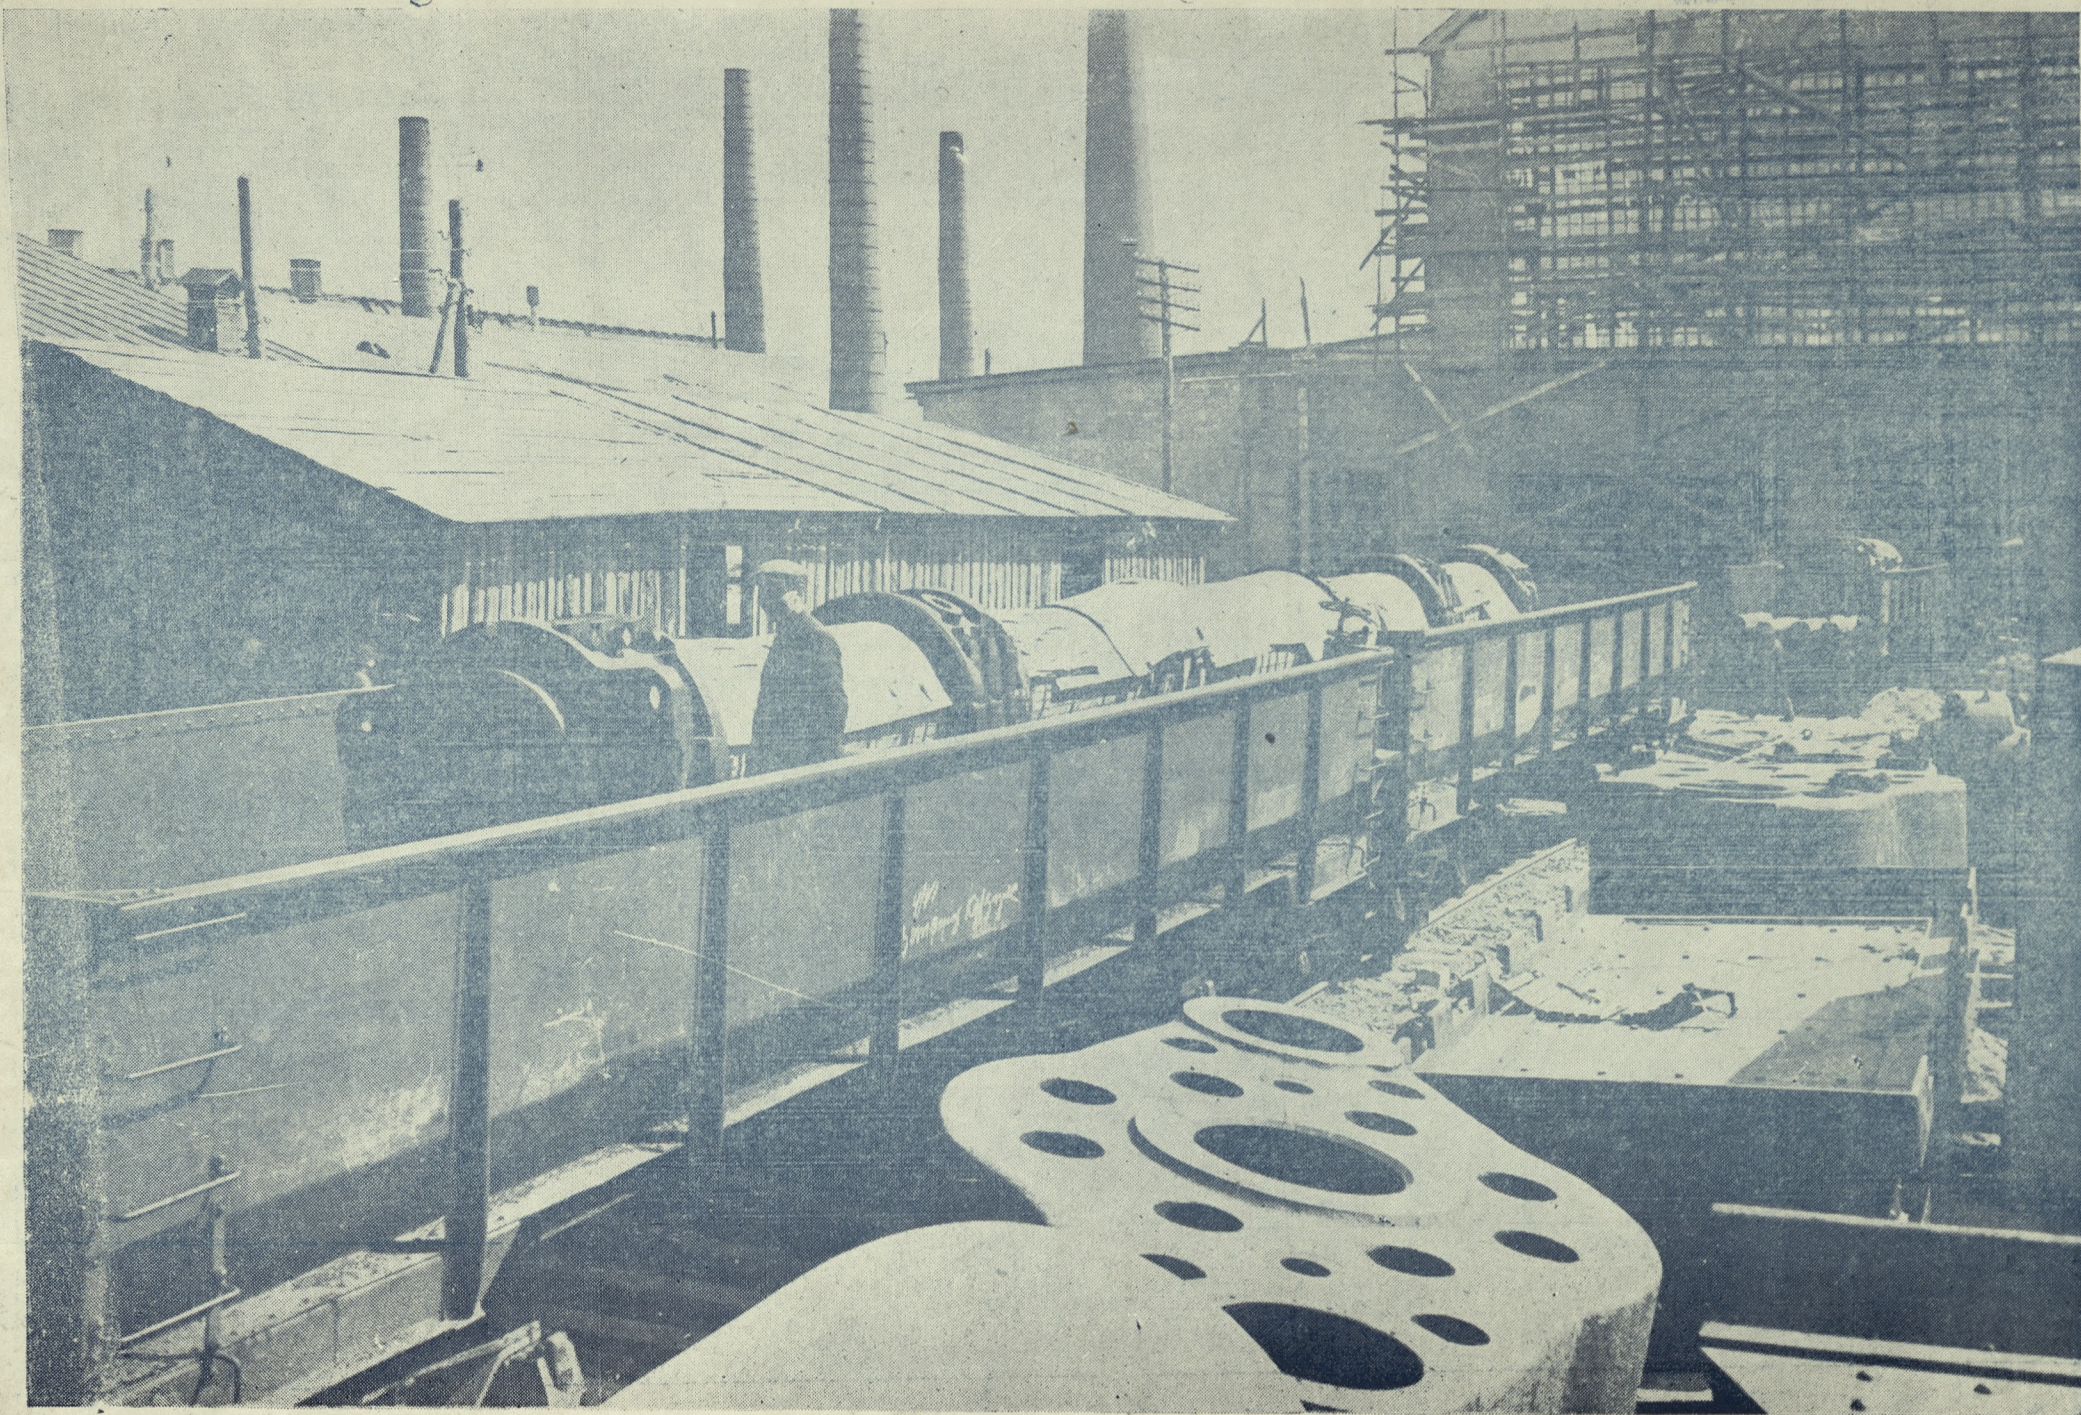

Прибывшие части прессы в 10.000 тон:

Выполнение плана сдачи в эксплуатацию жилых домов

(числитель—план, знаменатель—выполнение).

1	И ю л ь			А в г у с т			С е н т я б р ь			И т о г о за 3-й квар.			Всего сдано в эксплуатацию по 1-ое октября 1932 г.			
	Колич. домов.	Жилая площадь (кв. м.)	о/о к плану.	Колич. домов	Жилая площадь (кв. м.)	о/о к плану	Колич. домов	Жилая площадь (кв. м.)	о/о к плану	Колич. домов	Жилая площадь (кв. м.)	о/о к плану	С начала года		С начала строительства	
													Кол. домов	Жил. площ. (кв. м.)	Кол. домов	Жил. площ. (кв. м.)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Каменные дома	$\frac{4}{3}$	$\frac{4960}{3984}$	80,3	$\frac{4}{3}$	$\frac{4960}{3720}$	75,0	$\frac{3}{-}$	$\frac{3720}{-}$	-	$\frac{8}{6}$	$\frac{9920}{7704}$	77,7	14	20284	33	42662
Деревянные „	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	18398
Каркасные „	-	-	-	-	-	-	$\frac{1}{-}$	$\frac{1030}{-}$	-	$\frac{1}{-}$	$\frac{1030}{-}$	-	26	11100	101	44499
Щитовые „	$\frac{5}{3}$	$\frac{3600}{2160}$	60,0	$\frac{3}{-}$	$\frac{2160}{-}$	-	$\frac{3}{1}$	$\frac{2160}{720}$	33,3	$\frac{9}{4}$	$\frac{6480}{2880}$	44,4	10	7200	10	7200
И т о г о	$\frac{9}{6}$	$\frac{8560}{6144}$	71,8	$\frac{7}{3}$	$\frac{7120}{3720}$	52,2	$\frac{7}{1}$	$\frac{6910}{720}$	10,4	$\frac{18}{10}$	$\frac{17430}{10584}$	60,7	50	38584	189	112759

Снабжение строит. материалами в 3-м квартале 1932 года

Приложение № 9.

Материалы	Единица измерения	Фонд 3 квартала	Поступило в счет фонда					Поступило от подсобн. предпр. и вне фонда				Всего поступило в 3 квартале	Потребность на 3 квартал	Поступил за кварт. в % к кварт. потребности	Остаток материалов				
			В июле	В августе	В сентябре	Итого в 3 квартале	% реализ. фонда	В июле	В августе	В сентябре	Итого в 3 квартале				На 1 июля	На 1 августа	На 1 сентября	На 1 октября	Остаток на 1 октября в % к ост. на 1 июля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 Лес круглый	м³	12000	3060	1960	2030	7050	62,5	3330	2590	3100	9020	16070	64876	24,8	207	559	320	310	149,7
2 „ пиленный	„	3000	2000	1900	2100	6000	200,0	4173	3302	3471	10951	16951	52946	32,0	564	1247	1383	1320	234,0
3 Фанера	„	223	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	560	—	—	—	—	—	—
4 Цемент	тн	7500	4432	3237	423	8092	114,8	—	—	—	—	8092	17348	46,6	499	1982	3363	2700	541,1
5 Алебастр	„	—	—	—	—	—	—	299	270	217	786	786	2625	29,9	44	94	144	58	131,8
6 Известь	„	—	—	—	—	—	—	1236	675	350	2261	2261	9416	24,0	105	405	424	345	328,6
7 Кирпич строит. красн.	т. шт.	—	—	—	—	—	—	545	599	540,5	1684,5	1684,5	2994	56,3	31	70	71	150	183,9
8 Бесцементные камни	„	—	—	—	—	—	—	108	78,5	87	273,5	273,5	669,5	40,9	73	81	86	84,5	115,7
9 Стекло	м²	42000	32300	20100	6900	59300	141,2	26000	5600	600	32200	91500	69698	131,3	6575	52243	55880	50000	760,6
10 Асбошифер	т. шт.	105	180	130	69	379	360,9	—	—	—	—	379	182	208,2	50	155	265	314	628,0
11 Толь	рул.	6400	1920	—	—	1920	30,0	—	—	—	—	1920	10586	18,1	198	1129	23	—	—
12 Руберойд	„	1100	881	401	—	1282	116,5	—	—	—	—	1282	2154	50,5	297	880	1045	830	279,5
13 Железо сортовое . .	тн.	2420	849	352	576	1777	73,4	—	—	—	—	1777	5399	32,9	1513	1834	655	720	47,6
14 „ листовое	„	3150	560	854	1762	3176	100,8	—	—	—	—	3176	2141	148,3	797	1041	38	282,5	35,4
15 „ кровельное	„	140	73	—	10	83	59,3	—	—	108	108	191	300	63,7	26	64	33	102,0	392,3
16 Балки и швеллера . .	„	224	68	35	—	103	46,0	—	—	—	—	103	516	20,0	326	324	228	193,0	59,2
17 Проволока катанка . .	„	144	—	70	17	87	60,4	—	—	—	—	87	530	16,4	4	2	2	12,5	312,5
18 Рельсы ж. д. типа 3-А	„	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1295	—	40	20	10	—	—
19 „ узкоколейные	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	317	—	—	—	—	—	—
20 Трубы чугунные	„	222	30	67	115	212	95,5	—	—	—	—	212	1200	17,7	574	587	645	731	127,4
21 „ железные	„	288	55	19	73	147	51,0	—	—	—	—	147	1868	7,9	78	96	98	104	133,3
22 Гвозди	„	70	—	5,5	32	37,5	53,6	—	—	—	—	37,5	182,5	20,5	24	9	9	11	45,8
23 Асбестовая пыль	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6000	—	48	—	—	—	—
24 Песок строительный . .	м³	—	—	—	—	—	—	10000	7330	7560	24890	24890	53651	46,4	1309	4200	2115	1536	117,3
25 Камень бутовый	„	—	—	—	—	—	—	3640	2180	2940	8760	8760	28970	30,2	7575	7700	6977	10245	135,2
26 Щебень	„	—	—	—	—	—	—	4580	4290	3580	12450	12450	42104	29,6	6927	4800	4284	3907	56,4

Примечание: Особым распоряжением НКТП дополнительно выделен фонд: по железу сортовому-800 тн. листовому-2150 тн. и балкам и швеллерам-50 тн., всего 3000 тонн. Указанные цифры не отражены в сентябрьском конъюнктурном обзоре. Кроме того в этой таблице уточнен фонд по рельсам и гвоздям.

Работа подсобных предприятий в 3-м квартале 1932 г.

	Един. измерения	Всего за 3-й кварт.			В том числе по месяцам									
					Июль			Август			Сентябрь			
		П л а н	В ы п о л н.		П л а н	В ы п о л н.		П л а н	В ы п о л н.		П л а н	В ы п о л н.		
			Абс. ч.	%		Абс. ч.	%		Абс. ч.	%		Абс. ч.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Кирпичный зав.														
Кирпич сырец	т. шт.	6156	3447	56,0	2160	1330	61,6	2160	1357	62,8	1836	760	41,4	
Кирпич стр. кр. (обож.).	„	4950	1930	39,0	1266	506	40,0	1452	764	52,6	2232	600	29,5	
В с е г о	т. руб.	586,2	248,6	42,4	174,3	85,6	49,1	235,8	107,0	45,4	176,1	56,0	31,8	
2. Деревообдел. комб.														
а. Цех стандартн. домов														
Детали станд. домов	т. руб.	480	70,6	14,7	220,0	60,5	27,5	220,0	10,1	4,6	40,0	—	—	
В с е г о	т. руб.	520,0	95,1	18,3	220,0	60,5	27,5	220,0	10,1	4,6	80,0	24,5	30,6	
б. Лесозавод														
Дранка штукатурн.	т. руб.	26,3	14,3	54,4	12,7	2,4	18,9	3,6	3,0	83,3	10,0	8,9	89,0	
Пиломатериалы	м³	38926	11252	28,9	13126	4482	34,1	13126	3214	24,5	12674	3556	28,1	
В с е г о	т. руб.	1155,0	340,9	29,5	393,6	132,5	33,7	384,5	96,3	25,0	376,9	112,1	29,7	
Всего по деревообд. комб.	т. руб.	1675,0	436,0	26,0	613,6	193,0	31,5	604,5	106,4	17,6	456,9	136,6	30,0	
3. Бесцементн. комбин.														
а. Бетонный цех.														
Заготовка и установка арматуры.	тн.	354	619	174,8	123	178	144,8	111	311	280,2	120	130	108,3	
Печи „Якимовича“	шт.	525	748	142,5	300	342	114,0	—	—	—	225	403	180,4	
В с е г о	т. руб.	235,0	269,9	114,8	96,9	96,1	99,2	77,4	83,7	108,1	60,7	90,1	148,4	
б. Бесцементный цех.														
Камни бесцементные	т. шт.	900	242,7	27,0	300	106,0	35,3	350	70,5	20,1	250	66,2	26,5	
В с е г о	т. руб.	787,2	218,5	27,8	259,0	86,9	33,6	284,1	66,1	23,3	244,1	65,5	26,8	
Всего по бесцементному комбинату.	т. руб.	1022,2	488,4	47,8	355,9	183,0	51,4	361,5	149,8	41,4	304,8	155,6	51,0	

	Един. измерения	Всего за 3-й кварт.			В том числе по месяцам								
					Июль			Август			Сентябрь		
		П л а н	В ы п о л н.		П л а н	В ы п о л н.		П л а н	В ы п о л н.		П л а н	В ы п о л н.	
			Абс. ч.	%		Абс. ч.	%		Абс. ч.	%		Абс. ч.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Рем. стр. дех													
Столярные работы . .	Усл. ед.	67925	52920	77,9	26520	19511	73,6	26520	16539	62,4	14885	16870	113,6
Мебельные	„ „	2393	2111	88,2	941	772	82,1	941	586	62,3	511	753	147,4
Плотничные	„ „	7812	6286	80,5	3120	2310	74,0	3120	2016	64,6	1572	1960	124,7
Кровельные	„ „	60540	59124	97,7	20468	15975	78,1	20468	20322	99,3	19604	22827	116,4
Малярные	„ „	163779	232439	141,9	51480	71447	138,8	51480	92203	179,1	60819	68789	113,1
Стекольные	„ „	103810	95250	91,7	43290	38083	88,1	43290	33109	76,5	17230	24058	139,6
Кузнечные	„ „	26421	26381	99,8	10485	9628	91,8	8786	6982	79,9	7200	9771	135,7
Всего	Т. руб.	614,4	549,0	89,3	231,7	186,4	80,5	230,7	178,9	77,6	152,0	183,7	120,8
5. Известковый карьер.													
Камень известков. . . .	Кб. м.	1500	196	13,1	1500	196	13,1	—	—	—	—	—	—
Известь обожжен. . . .	Тн.	1500	607	40,5	1200	352	29,3	300	255	85,0	—	—	—
Всего	Т. руб.	116,1	37,0	31,9	79,9	19,7	24,6	26,2	15,5	59,2	10,0	1,8	18,0
6. Исетский карьер.													
Камень бутовый	Кб. м.	31792	25241	79,7	12696	9632	75,9	12896	9884	76,6	6200	5725	92,3
Щебень и отсев	Кб. м.	35008	23094	66,0	13104	7682	65,7	13104	7720	59,7	8800	7692	87,4
Всего	Т. руб.	467,3	327,3	70,0	177,7	114,9	64,7	178,0	116,7	56,6	111,6	95,7	85,8
7. Калининский карьер.													
Песок бетонно-стр. . .	Кб. м.	15000	6517	43,4	5000	1492	29,8	5000	1681	33,6	5000	3344	66,9
Балласт и гал.	„ „	2250	1114	49,6	2000	768	38,4	250	240	96,0	—	106	—
Всего	Т. руб.	65,1	28,7	44,1	26,2	8,5	32,5	19,6	7,2	36,8	19,3	13,0	67,4
8. Березитский карьер.													
Песок бетонно-строит.	Кб. м.	37400	24176	64,6	14000	9689	69,2	15400	7604	49,4	8000	6880	86,0
Балласт и гал.	„ „	21332	5797	27,2	5000	1695	33,9	9200	3106	33,8	7132	996	14,0
Всего	Т. руб.	144,4	73,5	50,9	46,4	27,7	59,7	60,0	26,2	43,7	38,0	19,6	51,6
9. Колыткинский карьер.													
Песок форм. красн. . .	Тн.	6000	667	11,1	2000	341	17,1	2000	119	6,0	2000	207	10,4
Известь обожж.	„	5250	2120	40,4	2250	120	5,4	1500	1030	68,7	1500	970	64,7
Всего	Т. руб.	501,1	111,3	22,2	206,7	16,7	8,1	153,3	49,6	32,4	141,1	45,0	31,9
Итого по всем предпр.	Т. руб.	5191,8	2299,8	44,3	1912,4	835,5	43,7	1869,6	757,3	41,0	1409,8	707,0	59,1
Лесозаготовки.													
<i>Заготовка.</i>													
Деловой древесины . .	Фм.	39000	9278	23,8	12000	7416	61,8	10000	1618	16,2	17000	244	1,4
Дров.	Кб. м.	27000	7044	26,1	10000	3647	36,4	5000	2287	45,7	12000	1110	9,3
<i>Вывозка.</i>													
Деловой древесины . .	Фм.	60000	13590	22,6	20000	7108	35,5	20000	2186	10,9	20000	4296	21,5
Дров.	Кб. м.	45000	14879	33,1	20000	4287	21,4	10000	8780	87,8	15000	1812	12,1
Всего	Т. руб.	930,2	236,0	25,4	325,5	130,3	40,0	253,7	67,5	26,6	351,0	38,2	10,9

П р и м е ч а н и е:

В таблице даны количественные выражения только по основным видам продукции подсобных предприятий. Денежные суммы дают весь объем продукции каждого предприятия.

Показатели по труду по УМС за 3-ий квартал 1932 г.

а. Обеспеченность рабсилой

	Всего за 3-ий квартал			В том числе по месяцам								
	Колич. рабочих по плану	Средне-спич. сочн. число	оо обеспе- ченности	И ю л ь			А в г у с т			С е н т я б р ь		
				Колич. рабочих по плану	Средне-спич. сочн. число	оо обеспе- ченности	Колич. рабочих по плану	Средне-спич. сочн. число	оо обеспе- ченности	Колич. рабочих по плану	Средне-спич. сочн. число	оо обеспе- ченности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Промышленное стр-во	5728	3099	54,1	5649	3392	60,0	6077	3028	49,8	5458	2877	52,7
Городское „	4026	2031	50,4	4524	2813	62,2	3915	1752	44,7	3641	1529	41,9
Стр. группы подсобн. предпр.	249	179	71,9	254	210	82,6	208	172	82,6	285	155	54,4
Гр. механиз. строит. работ	849	572	67,3	935	579	61,9	1000	596	59,6	611	542	88,8
Итого по чист. стр-ву	10852	5881	54,2	11362	6994	61,5	11200	5548	49,5	9995	5103	51,1
Подсобные предприятия	3536	2345	66,5	3865	2642	68,3	3701	2295	62,0	3023	2098	69,4
Обслуживающие единицы	4751	2874	60,5	5451	3031	55,6	4280	2955	69,0	4523	2635	58,2
Лесозаготовки	1895	599	31,6	1254	767	61,1	2100	613	29,6	2330	416	17,8
Монтажно-техн. упр.	4170	2871	68,8	4832	3607	74,6	3750	2567	68,5	3930	2436	62,0
В т. ч. Производство	791	526	66,8	1699	1161	68,3	293	233	79,5	382	186	48,7
„ монтаж	2658	1798	67,5	2636	1921	72,8	2714	1765	65,0	2624	1703	64,9
„ эксплуатация	721	547	75,8	497	525	132,9	743	569	76,5	924	547	59,2
Всего по УМС	25204	14570	57,8	26764	17041	63,6	25031	13978	55,8	23801	12688	53,3
Кр. того Востокотеплострой	—	159	—	—	228	—	—	161	—	—	88	—

б. Движение рабсилы

1	Средне-спич. число рабочих в 3 кварт.	Прибыло		У б ы л о							
		Всего в 3-м кварт.	В т. ч. в сент. месяце	Общая убыль				В т. ч. текучесть			
				Всего в 3 кварт.		В т. ч. в сент. м-це		Всего в 3 кварт.		В т. ч. в сент. м-це	
				Абс. ч.	‰	Абс. ч.	‰	Абс. ч.	‰	Абс. ч.	‰
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Промышленное стр-во	3099	697	274	1805	19,4	355	12,3	1427	15,3	318	11,0
Городское „	2031	1047	391	1733	28,4	331	21,7	1385	22,7	311	20,3
Строит. группы подсобн. предпр.	179	103	34	127	23,6	25	16,1	79	14,7	22	14,1
Гр. механиз. строит. работ. .	572	91	6	143	8,3	84	15,4	103	6,0	62	11,4
Итого по чист. стр-ву . .	5881	1938	705	3808	21,5	795	15,6	2994	16,9	713	14,0
Подсобные предприятия . . .	2345	782	196	1189	16,9	261	12,4	907	12,9	160	7,6
Обслуживающие единицы . .	2874	1027	199	1265	14,6	449	17,0	924	10,7	193	7,3
Лесозаготовки	599	137	45	220	12,2	37	8,8	203	11,3	37	8,8
Монтажно-техн. упр.	2871	898	242	1104	12,8	271	11,1	779	9,0	160	6,6
В т. ч. Производство	526	113	19	229	14,4	18	9,7	192	12,1	13	7,0
„ Монтаж	1798	607	188	731	13,5	212	12,4	482	8,9	126	7,4
„ Эксплоатация.	547	178	35	144	8,7	41	7,5	105	6,4	21	3,8
Всего по УМС . .	14570	4782	1387	7586	17,6	1813	14,3	5807	13,4	1263	9,8
Кр. того Востокотеплострой .	159	19	11	113	23,7	16	18,2	72	15,1	16	18,2

В. Невыхода на работу

		Всего человеко дней явок и неявок на работу			В Т О М Ч И С Л Е:						Н Е Я В К И Н А Р А Б О Т У П О П Р И Ч И Н А М											
					Я в о к			Н е я в о к			Выходные дни			П р о г у л ы						Отпуск, болезнь, выпол. госуд. и обществ. обяз.		
		По уважительным причинам												По неуважитель- ным причинам								
		Июль	Август	Сент.	Июль	Август	Сент.	Июль	Август	Сент.	Июль	Август	Сент.	Июль	Авг.	Сент.	Июль	Авг.	Сент.	Июль	Авг.	Сент.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Пром. стр-во . . .	абс. ч.	105239	93869	86299	80406	69677	64305	24833	24192	21994	16690	14149	14174	567	440	647	1615	1475	995	5961	8128	6178
	% %	100	100	100	76,40	74,24	74,51	23,60	25,76	25,49	15,86	15,07	16,42	0,54	0,46	0,76	1,53	1,57	1,15	5,67	8,66	7,16
Город. стр-во . . .	абс. ч.	97206	54321	45886	74008	38369	32551	23198	15052	13335	12489	8156	7626	599	350	843	4031	1796	1185	6079	5650	3681
	% %	100	100	100	76,14	70,63	70,94	23,86	29,37	29,06	12,84	15,01	16,62	0,62	0,64	1,84	4,15	3,30	2,58	6,25	10,42	8,02
Стр. группы подсоб. предпр.	абс. ч.	6503	5319	4674	4722	3939	3579	1781	1380	1095	1031	846	740	175	233	122	198	129	41	377	172	192
	% %	100	100	100	72,61	74,07	76,57	27,39	25,93	23,43	15,85	15,90	15,83	2,87	4,38	2,61	1,26	2,42	0,88	5,84	3,23	4,11
Гр. Мех. Стр работ	абс. ч.	17250	18475	16260	12879	13608	11888	4371	4867	4372	2966	3207	2826	61	54	32	100	74	71	1244	1532	1443
	% %	100	100	100	74,66	73,66	73,11	25,34	26,34	26,89	17,19	17,36	17,38	0,36	0,28	0,20	0,58	0,40	0,44	7,21	8,30	8,87
Итого по чист. стр-ву	абс. ч.	226198	171984	153119	172015	125593	112323	54183	46391	40796	33176	26358	25366	1402	1077	1644	5944	3474	2292	13661	15482	11494
	% %	100	100	100	76,05	73,03	73,35	23,95	26,97	26,65	14,67	15,33	16,57	0,62	0,63	1,07	2,63	2,02	1,49	6,03	8,99	7,52
Подсобн. предпр. .	абс. ч.	76231	71163	62920	55282	51634	45979	20949	19529	16941	12395	11469	10698	887	547	885	1490	1188	865	6177	6325	4493
	% %	100	100	100	72,45	72,56	73,07	27,45	27,44	26,93	16,24	16,11	17,00	1,16	0,77	1,40	1,95	1,66	1,37	8,10	8,90	7,16
Обслужив. едн. . .	абс. ч.	90242	91617	79061	72817	72168	60710	17425	19449	18351	14304	15328	15058	282	249	223	654	684	506	2185	3188	2564
	% %	100	100	100	81,67	78,77	76,79	18,33	21,23	23,21	16,04	16,73	19,04	0,32	0,27	0,28	0,73	0,74	0,64	2,45	3,49	3,25
Лесозаготовки . .	абс. ч.	16116	19022	12491	12033	15348	9434	4083	3674	3057	3090	2847	2141	46	20	77	333	28	157	614	779	682
	% %	100	100	100	74,66	80,68	75,52	25,34	19,32	24,48	19,17	14,96	17,14	0,29	0,12	0,64	2,07	0,15	1,25	3,81	4,09	5,45
Мон. тех. упр. . . .	абс. ч.	111892	79605	73559	78125	54014	53297	33767	25591	20262	14984	11430	10646	1787	1211	489	1716	1506	936	15280	11444	8191
	% %	100	100	100	69,82	67,84	72,48	30,18	32,16	27,52	13,25	14,35	14,47	1,58	1,52	0,66	1,51	1,94	1,26	13,49	14,35	11,13
Производство . . .	абс. ч.	36000	7208	5584	22344	3769	3740	13656	3439	1844	4368	858	497	1150	593	146	470	196	60	7668	1792	1141
	% %	100	100	100	62,07	52,28	66,98	37,93	47,72	33,03	12,13	11,90	8,90	3,19	8,22	2,62	1,31	2,75	1,08	21,29	24,85	20,43
Монтаж	абс. ч.	59544	54710	51086	43933	37577	37171	15611	17133	13915	7953	7512	7282	589	483	285	1088	1101	730	5981	8037	5618
	% %	100	100	100	73,78	68,68	72,77	26,22	31,32	27,23	13,36	13,73	14,28	1,00	0,90	0,56	0,83	2,01	1,37	10,05	14,68	11,02
Эксплоатац. . . .	абс. ч.	16300	17687	16889	11810	12668	12386	4490	5019	4503	2655	3060	2867	48	135	58	156	209	146	1631	1615	1432
	% %	100	100	100	72,53	71,61	73,34	27,57	28,39	26,66	16,29	17,30	16,98	0,25	0,76	0,34	0,80	1,21	0,86	6,84	9,12	8,48
Всего по УМС . . .	абс. ч.	520679	433391	381150	390272	318757	281743	130407	114634	99407	77949	67432	63909	4404	3104	3318	10137	6880	4756	37917	37218	27424
	% %	100	100	100	74,96	74,15	73,91	25,04	25,85	26,09	14,97	15,21	16,76	0,85	0,70	0,87	1,95	1,55	1,24	7,26	8,39	7,22

В том числе:

В том числе:

Производительность труда

Профессии	В % к нормам выработки					
	Промышленное стр-во.				Городск. стр-во	
	Июль	Август	Сентябрь	В среднем за квартал	Август	Сентябрь
1	2	3	4	5	6	7
Все профессии	108,2	111,2	117,3	102,0	112,0	106,5
В том числе:						
Землекопы	115,7	119,4	119,6	117,8	121,0	115,6
Плотники	121,3	115,7	124,5	120,4	110,9	113,5
Каменщики	139,6	131,4	147,9	139,3	87,8	140,0
Штукатуры	105,4	105,5	120,1	109,9	139,9	115,4
Бетонщики	119,2	120,1	145,1	127,7	222,9	105,6
Чернорабочие	92,3	99,2	98,9	96,6	87,9	85,3

Примечание По городскому строительству данные о производительности труда за июль месяц отсутствуют.

Средние заработки

Профессии	Промышленное стр-во				Городское стр-во			
	Июль	Август	Сентябрь	В среднем за 3-й квартал	Июль	Август	Сентябрь	В среднем за 3-й квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Все профессии	4-82	4-95	6-89	5-50	4-90	5-89	5-33	5-29
В том числе:								
Землекопы	5-13	5-78	6-91	5-83	6-40	6-86	5-66	6-56
Плотники	7-04	7-23	10-97	8-35	5-32	5-87	6-34	5-76
Каменщики	7-45	8-00	11-30	8-76	5-17	7-07	7-95	6-35
Штукатуры	6-15	5-27	7-78	6-35	4-20	5-77	5-91	5-22
Бетонщики	6-33	6-32	9-80	7-43	6-48	8-33	7-28	7-49
Чернорабочие	3-48	3-36	4-23	3-67	3-58	4-10	3-38	3-67

Обеспеченность рабсилой по группам и предприятиям УМС за 3-ий квартал 1932 г.

	Всего за 3-й квартал			В том числе по месяцам								
				Июль			Август			Сентябрь		
	Колич. рабочих по плану	Средне- спасочн. число	о/о обеспе- ченности	Колич. рабочих по плану	Средне- спасочн. число	о/о обеспе- ченности	Колич. рабочих по плану	Средне- спасочн. число	о/о обеспе- ченности	Колич. рабочих по плану	Средне- спасочн. число	о/о обеспе- ченности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Промышл. стр-во.	5728	3099	54,1	5649	3392	60,0	6077	3028	49,8	5458	2877	52,7
В том числе:												
1 гр. Кузн.-прессов. цех и др. . .	811	644	79,4	906	763	84,2	836	600	71,7	690	568	82,3
2-3 гр. Механ. цех, Заводоупр. и др.	1144	768	67,1	1381	774	56,0	1234	695	56,3	816	834	102,2
4 гр. Электроот., Газогенер. ст. и др.	1103	425*	38,5	800	503	62,8	1163	416	35,4	1347	356	26,4
6 гр. Санит.-техн. сооружения . .	997	439	44,0	945	466	49,3	1100	437	39,7	945	415	43,9
7 гр. Дорожное строительство . .	1362	707	51,9	1225	782	63,8	1422	749	52,6	1440	589	40,9
Постройка эстакады	311	116	37,3	392	104	26,5	322	131	40,6	220	115	52,2
Б. Городское стр-во.	4026	2031	50,4	4524	2813	62,2	3915	1752	44,7	3641	1529	41,9
В том числе:												
1 гр. Жил. и обществ. здания . .	2004	944	47,1	2210	1207	54,6	1656	862	52,0	2145	763	25,5
2 гр. Экскаваторстрой	1143	691	60,4	963	899	93,3	1474	659	44,7	992	516	82,0
3 гр. Теплофикация поселка и парк культуры и отдыха	188	33	17,5	380	71	18,6	185	28	15,1	—	—	—
4 гр. Доделочные работы по каркасным домам	438	214	48,8	211	189	89,5	600	203	33,8	504	250	49,6
5 гр. Благоустройство	147	87	59,1	440	260	59,0	—	—	—	—	—	—
6 гр. Электромонтажная	106	62	58,4	320	187	58,4	—	—	—	—	—	—
В. Группа мех. строит. работ	849	572	67,3	935	579	61,9	1000	596	59,6	611	542	88,8
Г. Производство.	791	526	66,8	1699	1161	68,3	293	233	79,5	382	186	48,7
В том числе:												
Цех металлич. констр.	476	299	62,8	1427	898	62,9	—	—	—	—	—	—
Ремонтно-механ. цех	315	227	72,0	272	263	96,6	293	283	79,5	382	186	48,6
Д. Монт. и эксплуат. гр.	3379	2345	69,4	3133	2446	78,0	3457	2334	67,5	3548	2250	63,4
В том числе:												
Пр.-монт. конт. по механ. монт. . .	288	182	63,2	365	201	55,0	267	181	67,8	232	164	70,6
„ „ „ по кран. и под. уст.	225	183	81,3	219	192	87,6	212	178	84,0	245	178	72,6
„ „ „ по литейн. цехам . .	72	60	84,7	107	84	78,6	63	56	88,8	47	41	87,2
„ „ „ по монт. куз.-прес. и терм. цехов	226	133	58,8	250	137	54,8	220	122	55,4	208	139	66,8
Пр.-электро-монтажн. контора . .	523	322	61,5	419	278	66,3	584	329	56,3	566	360	63,6
Пр.-монт. конт. по энергет. устан.	629	310	49,3	599	363	60,6	596	297	44,4	692	272	39,3
„ „ „ по кот.-мост. раб. .	521	421	80,8	500	475	95,0	617	427	68,1	445	362	81,3
Ремонтно-сварочн. контора	134	148	110,4	127	147	115,7	120	144	120,0	154	152	98,8
Монтажн. конт. водопр. и канализ. .	40	38	95,0	50	44	88,0	35	36	102,8	35	35	100,0
Пр. электро-монт. конт. (экспл.) .	281	208	74,0	184	183	99,4	250	205	82,0	409	237	57,9
Пр.-монт. конт. по энерг. уст. (экспл.)	307	233	75,6	199	246	124,2	379	260	68,6	345	194	56,2

	Всего за 3-ий квартал			В том числе по месяцам									
				И ю л ь			Август			Сентябрь			
	Коллч. рабочих по плану	Средне- спасочн. число	% обеспе- ченности	Коллч. рабочих по плану	Средне- спасочн. число	% обеспе- ченности	Коллч. рабочих по плану	Средне- спасочн. число	% обеспе- ченности	Коллч. рабочих по плану	Средне- спасочн. число	% обеспе- ченности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Гр. Эксплоат водопров. и канализ.	133	106	79,6	115	96	83,4	114	105	92,1	170	116	68,2	
Е. Подсобные предприятия	3536	2345	66,6	3865	2642	68,9	3701	2295	62,8	3023	2098	68,0	
В том числе:													
Кирпичный завод	443	275	62,0	450	297	66,0	493	271	54,9	386	257	66,6	
Бетонный „	123	98	79,6	123	112	91,0	132	114	86,3	115	68	59,1	
Бесцементный комбинат	589	239	40,5	664	296	44,6	640	218	34,0	463	204	44,1	
Деревообделочный комбинат	590	290	49,1	622	346	55,6	557	280	50,2	593	244	41,1	
Рем.-строит. цех	435	373	85,8	457	370	81,0	457	376	82,2	393	374	95,1	
Исетский карьер	649	555	85,5	769	613	79,7	669	545	81,4	510	507	99,4	
Калиновский „	79	81	102,5	130	118	90,8	52	66	126,9	57	60	105,2	
Березитский „	243	191	78,6	235	189	80,4	287	191	66,5	208	192	93,3	
Известковый „	74	42	56,7	144	76	52,8	38	35	92,1	40	14	35,0	
Колоткинский „	256	163	63,6	220	177	80,4	325	158	48,6	225	154	68,4	
Ж. Стронт. группы подо. предпр.	249	179	71,9	254	210	87,0	208	172	83,0	285	155	54,3	
З. Обслужив. единицы.	4751	2874	60,5	5451	3031	55,6	4280	2955	69,0	4523	2635	58,2	
Б том числе													
Жел.-дор. транспорт	636	454	71,3	636	456	71,6	640	445	69,5	632	461	72,9	
Автобаза	253	177	69,9	234	141	60,2	210	179	85,2	314	211	67,4	
Сельско-хоз. комбинат	2636	1572	59,6	3208	1683	53,5	2270	1643	72,2	2429	1390	57,2	
И. Лесоваготовки	1895	599	31,6	1254	767	61,1	2100	613	29,6	2330	410	17,8	
ВСЕГО по УМС													
Кроме того Востокотеплострой	—	159	—	—	228	—	—	161	—	—	88	—	
По стронт. профессиям:	Землекопы	2037	714	35,0	2110	955	45,2	2342	633	27,0	1660	555	33,4
	Плотники	1853	900	48,5	2023	1055	52,1	1860	863	46,3	1677	781	46,6
	Каменщики	310	206	66,4	314	269	85,6	327	205	62,6	290	143	49,3
	Штукатуры	508	318	62,6	521	358	68,7	568	330	58,1	434	268	61,7
	Бетонщики	495	253	51,1	443	280	63,2	481	229	47,6	572	250	43,7
	Чернорабочие	2843	1856	65,2	2793	2227	79,7	2944	1706	57,9	2793	1633	58,5
По производств. профессиям:	Слесаря	855	519	60,7	898	603	67,1	832	491	58,9	836	464	55,5
	Токаря	101	77	76,2	103	91	88,3	105	76	72,4	96	63	65,6
	Клепальщики	133	84	63,1	265	154	58,1	68	51	75,0	66	48	72,7
	Сверловщики	111	72	64,9	147	125	85,0	136	51	37,5	79	41	51,9
	Сборщики	118	71	60,1	234	137	58,5	74	43	58,1	48	34	70,8
	Электросварщики	115	111	96,5	234	187	79,9	62	74	119,3	49	71	144,8
	Такелажники	557	329	59,0	598	391	65,3	494	317	64,1	579	278	48,0
Кроме того:													
Инженерно-техн. раб.	1107	1057	95,4	1103	1186	107,5	945	928	98,2	1273	1056	82,9	
Служащие	1496	1663	111,1	1405	1793	127,6	1794	1694	94,4	1288	1503	116,6	
Младш. обслуж. персонал	1351	1577	116,7	1389	1723	124,6	1306	1569	120,1	1359	1440	105,9	
Ученики	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	142	—	
Композиторы	742	214	28,8	766	224	29,2	740	210	28,3	719	209	29,0	

Движение рабсилы по группам и предприятиям Уралмашиностроя

Группы и предприятия	Средне-спасное число рабочих в 3 квартале	П р и б ы л о		О б щ а я	
		Всего в 3 квартале	В т. ч. в сент. месяце	Всего в 3 квартале	
				Абс. ч.	‰
1	2	3	4	5	6
А. Промышленное стр-во	3099	697	274	1805	19,4
В том числе:					
1 гр. Кузн.-Прессов. цех и др.	644	124	39	346	17,9
2-3 гр. Механ. цех, Заводоупр. и др.	768	270	117	469	20,3
4 гр. Электроотоп., Газ. генер. ст. и др.	425	83	22	227	17,8
6 гр. Санит. технич. сооружения	439	126	47	203	15,4
7 гр. Дорожное строительство	707	54	37	487	22,9
Постройка эстакады	116	40	12	73	20,8
Б. Городское стр-во	2031	1047	391	1733	28,4
В том числе:					
1 гр. Жил. и обществ. здания	944	460	187	881	31,1
2 гр. Экскаваторстрой	631	295	89	464	22,3
3 гр. Теплоф. поселка и парк культ. и отдыха	33	5	—	71	71,7
4 гр. Доделочн. работы по каркасн. домам	214	237	115	213	33,1
5 гр. Благоустройство	87	41	—	48	18,4
6 гр. Электромонтажная	62	9	—	56	29,9
В. гр. Механиз. строит. работ.	572	91	6	143	8,3
Г. Производство	526	113	19	229	14,4
В том числе:					
Цех металлич. констр.	299	46	—	130	14,4
Ремонтно-механ. цех	227	67	19	99	14,5
Д. Монт. и эксплуат. группы	2345	785	223	875	12,4
В том числе:					
Пр.-монт. конт. по механ. монтажу	182	62	3	109	20,3
" " " по кран. и под. устан.	183	44	19	79	14,4
" " " литейных цехов	60	7	2	21	11,5
" " " по монт. кузн.-пр. и терм. цехов	133	71	42	67	16,8
Пр.-электро-монтажн. контора	322	117	39	90	9,3
Пр. монт. конт. по энергет. устан.	310	129	33	120	12,8
" " " по кот.-мост. работам	421	132	40	215	17,0
Ремонтно-сварочн. контора	148	30	9	19	4,3
Монт. конт. водопр. и канализации	38	10	1	11	9,5
Пр. Электро-монт. конт. (экспл.)	209	71	21	36	5,8
Пр. Монт. контора энергоуст. (экспл.)	233	63	5	87	12,4
Гр. Эксплоат. водопров. и канализ	108	44	9	21	6,6

и невыхода на работу за 3-ий квартал 1932 года

У Б Ы Л О						НЕВЫХОДА НА РАБОТУ					
убыль		В т. ч. текучесть				Общий % неявок на работу			В т. ч. прогулы по уваж. причинам		
В т. ч. в сент. м-це		Всего в 3 квартале		В т. ч. в сент. м-це		И ю л ь	А в г у с т	С е н т я б р ь	И ю л ь	А в г у с т	С е н т я б р ь
Абс. ч.	‰	Абс. ч.	‰	Абс. ч.	‰	13	14	15	16	17	18
7	8	9	10	11	12						
355	12,3	1427	15,3	318	11,0	23,60	25,76	25,49	1,53	1,57	1,15
35	6,2	172	8,9	31	5,5	28,09	31,23	29,87	2,72	1,78	0,79
106	12,7	420	18,2	103	12,3	24,83	26,61	24,27	1,64	1,27	0,95
46	12,9	221	17,3	43	12,1	25,41	31,09	29,11	1,35	1,89	2,12
47	11,3	144	10,9	37	8,9	20,68	22,57	26,07	1,09	1,32	0,92
77	13,1	412	19,4	60	10,1	18,26	19,92	20,10	0,44	1,35	0,74
44	38,2	58	16,5	44	22,1	25,71	23,52	26,92	2,55	3,19	4,33
331	21,7	1385	22,7	311	20,3	23,86	29,37	29,06	4,15	3,30	2,58
193	25,2	719	25,3	184	24,1	22,48	30,34	29,60	5,20	2,90	3,07
92	17,8	362	17,4	84	16,2	24,29	28,95	28,72	3,17	3,32	2,06
—	—	63	63,6	—	—	26,80	47,95	—	3,97	17,77	—
46	18,4	165	25,5	43	17,2	31,48	30,49	23,12	2,68	3,02	2,14
—	—	27	10,4	—	—	24,86	—	—	4,79	—	—
—	—	49	26,2	—	—	22,84	—	—	0,82	—	—
84	15,4	103	6,0	62	11,4	25,34	26,34	26,89	0,58	0,40	0,44
18	9,7	192	12,1	13	7,0	37,93	47,72	33,03	1,31	2,75	1,08
—	—	110	12,9	—	—	36,24	—	—	1,41	—	—
18	9,6	76	11,1	13	6,9	43,68	47,72	33,03	1,10	2,75	1,08
253	11,2	587	8,3	147	6,5	26,50	30,60	27,10	1,64	1,81	1,29
24	14,6	46	8,5	6	3,6	22,22	27,79	20,23	2,05	1,52	0,66
24	13,4	54	9,8	17	9,7	34,16	40,37	32,29	5,59	6,87	4,55
9	21,9	16	8,8	5	12,1	29,29	39,54	36,17	2,42	1,57	2,26
12	8,6	50	12,5	2	1,4	26,16	30,22	29,19	3,68	3,34	3,00
32	8,8	60	6,2	16	14,3	25,41	30,03	27,15	0,95	1,62	1,27
30	11,0	64	6,9	12	4,4	28,69	27,78	25,78	1,75	1,53	1,26
75	20,7	169	13,3	62	17,1	21,69	30,52	27,19	0,70	0,90	0,46
4	2,6	13	2,9	4	2,6	23,06	36,51	29,48	—	1,19	0,11
2	5,8	9	7,8	2	5,8	21,32	24,92	19,23	0,53	1,73	0,28
13	5,4	27	4,3	8	3,4	26,90	31,05	28,82	1,32	0,99	0,97
26	13,4	64	9,1	11	5,6	23,53	27,95	28,05	0,79	1,67	1,10
2	1,7	14	4,4	2	1,7	21,63	24,27	19,75	5,13	0,48	0,77

Количество ударников и ударных бригад.

1	РАБОЧНИЕ				И. Т. Р.			СЛУЖАЩИЕ			ВСЕГО			Всего закрепи- вшихся (работч. ИТР и служа- щих)	
	Списочное число	Число ударных бригад	Всего ударников	о/о охвата	Списочное число	Всего ударников	о/о охвата	Списочное число	Всего ударников	о/о охвата	Списочное число	Всего ударников	о/о охвата		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Абс. ч.	о/о	
15	16														
На 1-е июля	17855	747	8353	46,8	1141	530	46,4	1879	513	27,3	20875	9396	45,0	6680	32,0
На 1-е августа	15736	819	8367	53,2	1087	500	46,0	1735	569	32,8	18558	9436	50,8	5530	29,8
На 1-е сентября	13052	789	7768	59,5	773	465	60,2	1170	480	41,0	14995	8713	58,1	4838	32,3
На 1-е октября	11661	740	7087	69,8	1028	407	39,6	1439	570	39,6	14128	8064	57,1	6073	43,0

Источники комплектования рабсилы.

	П Р И Б Ы Л О Р А Б О Ч Н Ы Х			Всего прибыло рабочих	В т. ч. женщин
	В порядке колдоговоров (вербованных)	В порядке самотека			
		Всего	В т. ч. охваче- но договорами по вербовке (на стройке)		
1	2	3	4	5	6
И ю л ь	Абс. ч.	44	1923	1192	477
	о/о о/о	2,24	97,76	60,58	24,23
А в г у с т	Абс. ч.	72	1356	359	351
	о/о о/о	5,05	94,95	25,16	24,59
С е н т я б р ь	Абс. ч.	135	1252	382	365
	о/о о/о	9,73	90,27	27,55	26,32
Итого за квартал.	Абс. ч.	251	4531	1933	1193
	о/о о/о	5,25	94,75	40,42	24,95

Т р а в м а т и з м.

М е с я ц ы	Общее число несчастных случаев	В Т О М Ч И С Л Е:			Коэффициент опасности
		Легкие	Тяжелые	Смертель- ные	
1	2	3	4	5	6
Июль	37	37	—	—	2,17
Август	27	26	—	1	1,93
Сентябрь	28	24	2	2	2,21
Итого за 3 квартал	92	87	2	3	2,10

26

26

26

26

26

26

26

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
1. Выполни. плана капит. работ за 3-ий кварт. и с нач. 1932 г.	2
2. Выполни. стройпрограммы по группам	8
3. Выполни. плана строит. работ в об'емных величинах по пром. строительству	12
4. Выполни. стройпрограммы по видам строит. работ	14
5. Использование механизмов по пром. и городскому стр-ву	16
6. Выполни. плана монт. работ монт.-техн. управлением	20
7. Выполни. плана работ группами и конторами МТУ	22
8. Выполни. плана сдачи в эксплуатацию жилых домов	23
9. Снабжение строит. материалами	24
10. Работа подсобных предприятий	25
11. Показатели по труду по УМС	27
12. Производительность труда	29
13. Средние заработки	29
14. Обеспеченность рабочей силой по группам и предприятиям УМС	30
15. Движение рабочей силы и невыхода на работу по группам и предприятиям УМС	32
16. Количество ударников и ударных бригад	36
17. Источники комплектования рабочей силы	36
18. Травматизм	36
19. Работа жел.-дор. транспорта	37
20. Финансирование	37

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ОТДЕЛ

ХИМИИ

621364


✓

مكتبة
الشيخ
الشيخ
الشيخ
الشيخ

15K

1821

с. 11

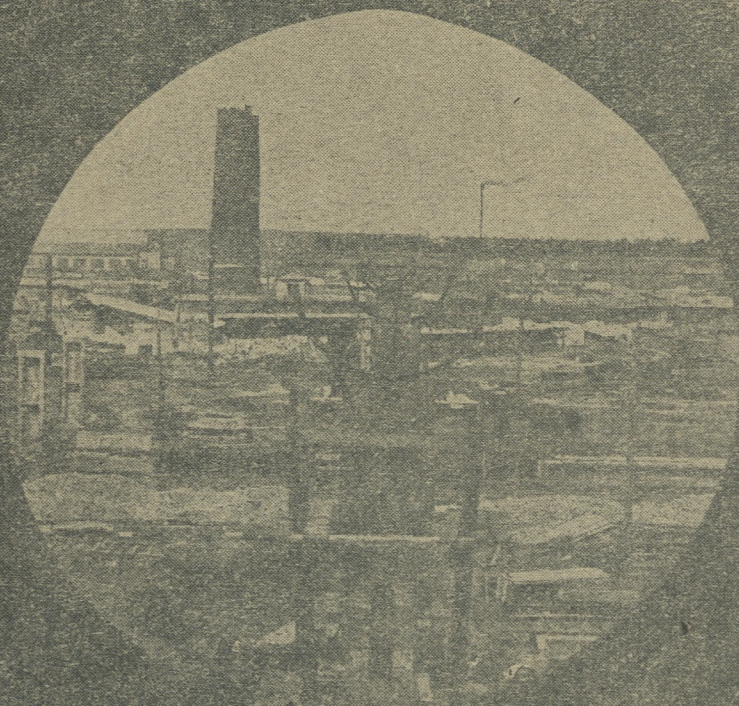

Вид из трубы газопровода.
